

SPRAWOZDANIE ZA 2019 ROK

Z REALIZACJI „PROGRAMU REWITALIZACJI EŁKU
NA LATA 2016-2023”

Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, 2020 r.


Spis treści

| | |
|--|----|
| Wprowadzenie | 3 |
| 1. Stopień realizacji podstawowych projektów rewitalizacyjnych | 5 |
| 2. Analiza wskaźnikowa | 24 |
| 3. Sprawozdanie z działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA” | 43 |
| Podsumowanie | 46 |

Wprowadzenie

W 2016 r. Rada Miasta Ełku przyjęła „Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”. Dokument został opracowany w oparciu o nowe podejście do procesu odnowy obszarów miejskich, zaprezentowane w rządowych „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”. Przygotowana została diagnoza całego miasta w oparciu o podziały urbanistyczne, bazujące na utrwalonych związkach przestrzennych, funkcjonalnych i społeczno-ekonomicznych. Diagnoza zawiera szczegółową analizę problemów społecznych oraz gospodarczych, technicznych, przestrzenno-funkcjonalnych i środowiskowych. Na jej podstawie zostały wyznaczone obszary zdegradowane, a spośród nich **obszar rewitalizacji o nazwie „Śródmieście”**, obejmujący (zgodnie z wytycznymi) nie więcej niż 20% powierzchni Ełku (172 ha – 8,17%) i zamieszkały przez nie więcej niż 30% mieszkańców (16 579 mieszkańców – 28,20%).

Rysunek 1 Obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji „Śródmieście”.

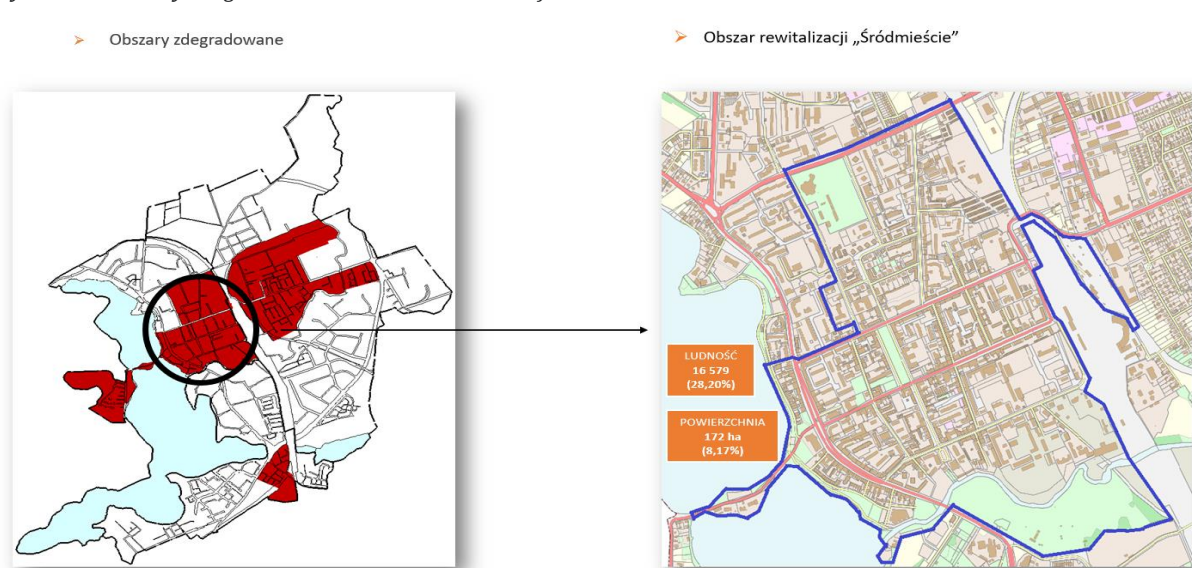

Następnie, przy udziale społeczności lokalnej, dokonano wyznaczenia kierunków i zaplanowania kompleksowych przedsięwzięć (integrujących działania społeczne, gospodarcze, przestrzenne, techniczne itp.), które w rezultacie mają wyprowadzić obszar rewitalizacji ze stanu kryzysowego i silniej włączyć go w rozwój całego miasta.

Celem głównym

rewitalizacji Śródmieścia Ełku jest zaktywizowanie społeczne, gospodarcze i infrastrukturalne obszaru zagrożonego marginalizacją i silniejsze włączenie go w procesy rozwojowe.

| | | |
|---|---|--|
| <p>Cel 1. Zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości.</p> | <p>Cel 2. Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych.</p> | <p>Cel 3. Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych.</p> |
| <p>Cel 4. Podniesienie społecznej i gospodarczej atrakcyjności przestrzeni publicznych.</p> | <p>Cel 5. Wzrost potencjału turystycznego, sportowo-rekreacyjnego i kulturalnego w oparciu o zasoby przyrodnicze i dziedzictwa kulturowego.</p> | <p>Cel 6. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej</p> |

W osiągnięciu powyższych celów pomóc ma zaplanowany **system monitorowania realizacji programu, prowadzony na dwóch poziomach:**

1. przedstawienie informacji od beneficjentów projektów wpisanych do programu nt. realizacji danego projektu w roku sprawozdawczym, w tym sprawozdania Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej z wdrażania modelu rewitalizacji w Mieście Ełk;
2. analiza wskaźników sytuacji społeczno-gospodarczej dla całego miasta i obszaru rewitalizacji.

Monitoring realizacji „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” prowadzi Wydział Strategii Rozwoju Urzędu Miasta Ełku. Projekt sprawozdania za dany rok jest opiniowany przez Zespół ds. rewitalizacji Miasta Ełku oraz Ełckie Forum Rewitalizacji. Prezydent Miasta, w terminie do 30 czerwca każdego roku, przedstawia sprawozdanie Radzie Miasta Ełku. Sprawozdanie jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku.

STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

1. Stopień realizacji podstawowych projektów rewitalizacyjnych


Projekty ujęte w programie rewitalizacji zostały podzielone na 3 typy:

- ❖ **podstawowe projekty rewitalizacyjne**, realizowane w obszarze rewitalizacji i skierowane do mieszkańców tego obszaru, których realizacja w największym stopniu wpłynie na poprawę sytuacji w Śródmieściu Ełku;
- ❖ **uzupełniające rodzaje działań rewitalizacyjnych** tj. takie, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów Programu;
- ❖ **projekty komplementarne do projektów rewitalizacyjnych** – projekty skierowane do szerszego grona odbiorców, wykraczającego poza osoby z obszaru rewitalizacji, uzupełniające projekty rewitalizacyjne i dzięki którym prowadzone działania rewitalizacyjne nie będą skutkowały przenoszeniem problemów na inne obszary miasta lub nie będą prowadziły do niepożądanych efektów społecznych.

W corocznych sprawozdaniach monitorowany jest postęp w realizacji projektów podstawowych.

Te działania są bowiem najistotniejsze z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów rewitalizacji. W programie rewitalizacji znalazło się **55 projektów** podstawowych zgłoszonych przez samorząd miejski, samorząd powiatowy, jednostki samorządowe z obszaru pomocy społecznej i kultury, organizacje pozarządowe, kościoły, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Na koniec 2019 r. prawie trzy czwarte projektów było w trakcie realizacji lub zakończyła się. Większość projektów, wskazanych jako nierealizowane, prawdopodobnie nie będzie wdrażanych ze względu na zbyt wysokie koszty lub rezygnację beneficjentów. Projekty nierealizowane nie mają jednak kluczowego znaczenia dla osiągnięcia celów programu.

Wykres 1 Stopień realizacji projektów podstawowych w 2019 r., ujętych w „Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” (szt., %).

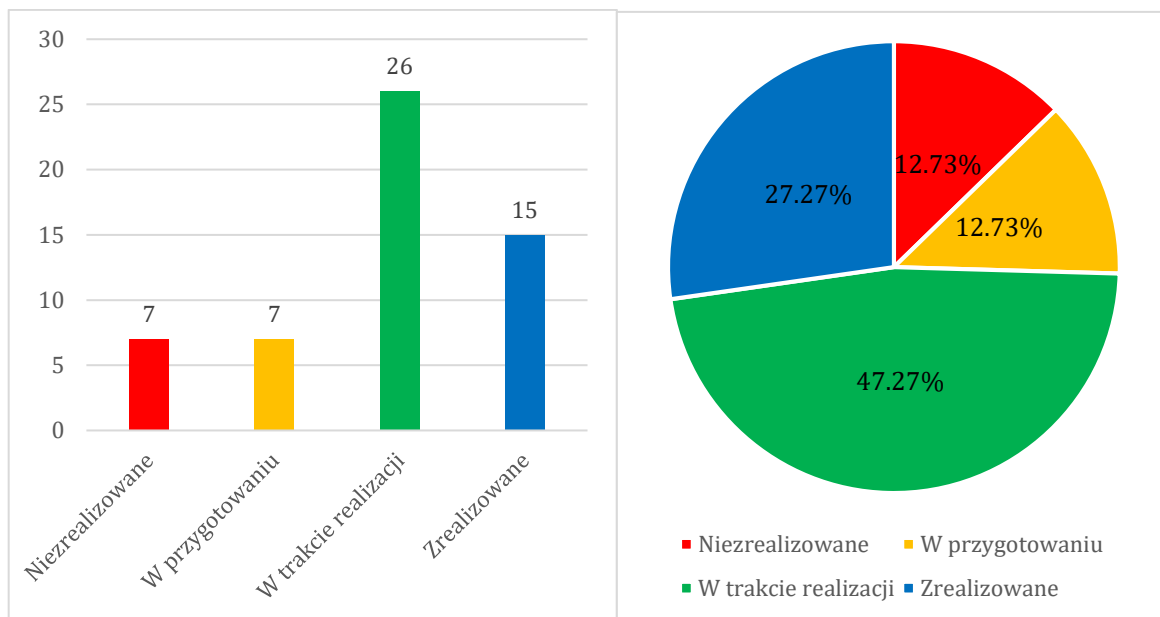

STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

| Lp. | Tytuł projektu | Beneficjent | Stan realizacji |
|-----|---|--|--|
| 1. | Rewitalizacja zespołu zamkowego w Ełku i obszaru wyspy zamkowej | PW Doryb Piotr Basiewicz, Piotr Basiewicz (właściciel) lub Fundacja Zamek w Ełku | <p>Projekt w przygotowaniu</p> <p>Beneficjent ma przeprowadzone badania archeologiczne i architektoniczne, powstały opracowania naukowe. Przygotowana jest również koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania wyspy zamkowej. Planowane jest wykonanie projektu budowlanego. W ubiegłym roku nie były prowadzone prace zmierzające do realizacji inwestycji.</p> |
| 2. | Przebudowa ul. Wojska Polskiego | Gmina Miasto Ełk | <p>Projekt zrealizowany</p> <p>W 2019 roku zakończyła się realizacja projektu „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – etap II”, w wyniku której przebudowana została ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza. Zakres prac objął m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie nawierzchni: jezdni, zatok autobusowych, chodników, ścieżki rowerowej; • „wyprostowanie” skrzyżowania ul. Amii Krajowej, ul. Zamkowej, ul. Wojska Polskiego (w celu dojechania z ul. Armii Krajowej do ul. Zamkowej nie będzie trzeba wykonywać nawrotek); • budowę oświetlenia ulicznego zintegrowanego z miejskim system sterowania i monitoringu oświetlenia; • modernizację sygnalizacji świetlnej; • montaż dodatkowych barierek ogrodzeniowych na pasie dzielącym; • wykonanie nowej ścieżki rowerowej z masy bitumicznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zamkowej; • budowę kanalizacji deszczowej; • wykonanie monitoringu wraz z kanalizacją teletechniczną; • budowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacji sanitarnej (koszt PWiK); • budowę odcinka sieci gazowej; • modernizację miejsc parkingowych i wyznaczenie miejsc dla niepełnosprawnych; • cofnięcie zatoki przystankowej na ul. Wojska Polskiego w okolice „Rolnika”, nowa zatoka przystankowa na ul. Armii Krajowej (naprzeciwko kościoła NSJ). <p>Całkowita wartość projektu to 10 610 658,09 zł, z czego dofinansowanie z RPO WiM wyniosło 4 558 681,01 zł. Wkład własny z budżetu miasta Ełku wyniósł 6 051 977,08 zł.</p> |

STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

| Lp. | Tytuł projektu | Beneficjent | Stan realizacji |
|-----|--|------------------|---|
| | | | W okresie realizacji ww. projektu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ełku sp. z o.o. przebudowało sieć wodno-kanalizacyjną. Na ten cel wydatkowano 1 822 613,19 zł. |
| 3. | Zagospodarowanie pustych przestrzeni dla rozwoju funkcji turystyczno – rekreacyjnych w mieście Ełk | Gmina Miasto Ełk | <p>Projekt zrealizowany</p> <p>Gmina Miasto Ełk zrealizowała w 2018 r. projekt pn. „Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku”. W ramach projektu, w obszarze rewitalizacji, przebudowane zostały następujące odcinki ścieżek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nad rzeką Ełk, w sąsiedztwie Placu Jana Pawła II; • w kierunku ul. Żeromskiego i Placu Katedralnego; • przy ul. Parkowej – V etap Parku Kopernika. <p>Została również usunięta stara i zamontowana nowa kładka na rzece Ełk, łącząca Plac Jana Pawła II z ul. Żeromskiego i Placem Katedralnym. Pojawiła się infrastruktura towarzysząca, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania inwestycji, w postaci m.in. miejsc do obsługi rowerów, murków parkowych z okładzinami granitowymi, drewnianych ławek do siedzenia, zagospodarowania zielenią, pozostałych elementów małej architektury oraz oświetlenia LED (częściowo wyposażonego w detektor ruchu).</p> <p>Całkowita wartość inwestycji to ok. 8,38 mln zł, a pozyskane wsparcie środkami UE wynosi ok. 4,44 mln zł.</p> |
| 4. | Przebudowa i modernizacja dróg w obszarze śródmieścia Ełku | Gmina Miasto Ełk | <p>Projekt w trakcie realizacji</p> <p>Projekt zakłada przebudowę dróg i skrzyżowań w obszarze rewitalizacji, z wyłączeniem ul. Wojska Polskiego (ujęta w projekcie nr 2). W 2019 r. nie przeprowadzono inwestycji na ulicach objętych projektem - Małeckich, Orzeszkowej, 3 Maja, Piłsudskiego, Mickiewicza, Roosevelta, Dąbrowskiego.</p> |
| 5. | Rewitalizacja ełckich podwórek | Gmina Miasto Ełk | <p>Projekt w trakcie realizacji</p> <p>Projekt zakłada modernizację 17 podwórek w „Śródmieściu Ełku”. W 2017 r. przeprowadzono prace inwestycyjne na 7 podwórkach. Natomiast w 2018 r. zmodernizowano następujące kolejne 9 podwórek.</p> <p>Remonty podwórek były w znacznej mierze finansowane ze środków UE. Z programu regionalnego Gmina Miasto Ełk pozyskała 3,9 mln zł (całkowita wartość projektu 6,56 mln zł),</p> |

STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

| Lp. | Tytuł projektu | Beneficjent | Stan realizacji |
|-----|--|--|--|
| | | | <p>a z programu transgranicznego Litwa Polska 1,3 mln zł (całkowita wartość projektu po stronie Ełku, wraz z działaniami społecznymi, to 2,2 mln zł).</p> <p>Łącznie zmodernizowanych zostało 16 z 17 podwórek założonych w projekcie. W 2019 r. zostało ogrodzone boisko przy ul. Mickiewicza 29 (59 478,56 zł – środki z budżetu miasta Ełku). Do modernizacji pozostało podwórko przy ul. Wojska Polskiego 35-39.</p> |
| 6. | Adaptacja budynku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej | Gmina Miasto Ełk | <p>Projekt zrealizowany</p> <p>W 2018 r. zakończyła się modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 27A, na który Gmina Miasto Ełk otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych (RPO WiM 2014-200, ZIT bis Ełk). Wymieniono pokrycie dachu, naprawiono elewację budynku, przeprowadzono termomodernizację, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, przebudowano pomieszczenia, wykonano instalacje wewnętrzne oraz przyłącza budynków do wszystkich mediów. W ramach inwestycji zagospodarowany został również teren wokół budynku i zbudowana droga dojazdowa do obiektu wraz z miejscami postojowymi. W budynku funkcjonuje Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia” (w nawiązaniu do dawnej funkcji z czasów funkcjonowania koszar wojskowych). Instytucja będzie fundamentem społecznego wymiaru rewitalizacji, zapewniając infrastrukturę i kapitał społeczny do przeprowadzenia tego procesu. Zostaną utworzone m.in. pracownie tematyczne w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych oraz współpracy międzypokoleniowej. Będą tam również prowadzone działania aktywizujące społecznie dzieci, młodzież i dorosłych. Z budynku będą korzystać ełccy animatorzy i pedagodzy ulicy, którzy będą realizowali zajęcia wspierające osoby borykające się z różnymi problemami.</p> <p>Całkowita wartość projektu to 4,79 mln zł, a dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu państwawyniosło3,94 mln zł.</p> |
| 7. | Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej (schemat A) | Gmina Miasto Ełk we współpracy z jednostkami organizacyjnymi JST i organizacją pozarządową | <p>Projekt w trakcie realizacji</p> <p>Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Alternatywa (partner wiodący).</p> <p>Uczestnikami projektu są osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 15-30 lat. Wsparciem objęte są osoby z tzw. grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne, zmagające się z wielowymiarowymi problemami i w związku z tym wymagające szerokiego spektrum działań, a także otoczenie</p> |

STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

| Lp. | Tytuł projektu | Beneficjent | Stan realizacji |
|-----|--|--|---|
| | | | <p>tych osób. Projekt przyczyni się do podniesienia aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Śródmieścia Ełku.</p> <p>W 2019 r. były realizowane następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozpoczęcie realizacji projektu; • rekrutacja uczestników; • diagnoza uczestników; • organizacja warsztatów, zajęć, treningów; • organizacja kursów zawodowych; • organizacja staży zawodowych; • poradnictwo specjalistyczne, konsultacje indywidualne, doradztwo zawodowe; • praca streetworkerów i animatorów; • realizacja projektów; • podejmowanie działań na infrastrukturze zrewitalizowanej. <p>Okres realizacji projektu: od 01.08.2018 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 27 249,34 zł.</p> |
| 8. | Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia (schemat A) | Gmina Miasto Ełk we współpracy z jednostkami organizacjami JST i organizacjami pozarządowymi | <p>Projekt w trakcie realizacji</p> <p>Celem projektu jest zwiększenie aktywności osób zamieszkałych na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, w wieku 18 - 65 lat, poprzez aktywizację społeczną i zawodową. W 2019 r. realizowane były następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozpoczęcie realizacji projektu; • rekrutacja uczestników; • diagnoza uczestników; • organizacja warsztatów, zajęć, treningów; • organizacja kursów zawodowych; • organizacja staży zawodowych; • poradnictwo specjalistyczne, konsultacje indywidualne, doradztwo zawodowe; • praca streetworkera i animatorów; • realizacja projektów socjalnych i kontraktów socjalnych; |

STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

| Lp. | Tytuł projektu | Beneficjent | Stan realizacji |
|-----|---------------------------------|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • podejmowanie działań na infrastrukturze zrewitalizowanej. <p>Projekt otrzymał wsparcie finansowe UE (instrument ZIT bis Ełk RPO WiM 2014-2020) w kwocie 1,36 mln zł (95% wartości całego projektu). Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. W ubiegłym roku poniesiono wydatki w wysokości 664 600,00 zł.</p> |
| 9. | Lokalne perspektywy (schemat A) | Gmina Miasto Ełk we współpracy z jednostkami organizacyjnymi JST oraz organizacjami pozarządowymi | <p>Projekt w trakcie realizacji</p> <p>Projekt jest wynikiem doświadczeń Gminy Miasta Ełk w obszarze animacji lokalnej oraz streetworkingu. Realizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenie Alternatywa i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Uczestnikami projektu są mieszkańcy obszaru rewitalizacji, zagrożeni ubóstwem i /lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne (tzw. oddalone od rynku pracy, III profil), oraz otoczenie tych osób. Wsparciem objęte są osoby, które od wielu pokoleń dziedziczą skutki wszelkiego rodzaju niedostatków (tzw. dziedziczona bezradność). Zespoły składające się z animatora + streetworkera pracują na podwórkach w obszarze rewitalizacji, w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia”, MOPS, na terenie Parku Kopernika i Parku Odkrywców Kolei.</p> <p>W 2019 r. realizowano następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozpoczęcie realizacji projektu; • rekrutacja uczestników; • diagnoza uczestników; • organizacja warsztatów, zajęć, treningów; • poradnictwo specjalistyczne, konsultacje indywidualne; • praca i animatorów; • realizacja projektów; • praca w podwórkach; • podejmowanie działań na infrastrukturze zrewitalizowanej. <p>Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>Wartość projektu wynosi ok. 1,15 mln zł, z czego dofinansowanie UE to 1,09 mln zł (95 % kosztów). W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 26 400 zł.</p> |

STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

| Lp. | Tytuł projektu | Beneficjent | Stan realizacji |
|-----|---|--|--|
| 10. | Modernizacja infrastruktury i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku przy ul. Piłsudskiego 8 | Gmina Miasto Ełk | <p>Projekt zrealizowany</p> <p>Prace remontowe i modernizacyjne prowadzone były w latach 2017 – 2018. W tym czasie budynek przeszedł gruntowne zmiany wewnątrz i na zewnątrz. Wyremontowano i wyposażono pomieszczenia znajdujące się na parterze oraz pierwszym piętrze, a także piwnicę, klatkę schodową i wiatrołap. Rozbudowane zostały skrzydła zachodnie i wschodnie (taras) o dodatkowe pomieszczenia. Nadbudowano również taras na wysokość drugiego piętra. Przeprowadzono termomodernizację budynku wraz z remontem pokrycia dachowego. Wyremontowano korytarz, pomieszczenia biurowe i piwnicę. Ostatnim etapem było zagospodarowanie terenu, m.in. wykonanie dojeżdżalni i dojazdów, a także zieleni.</p> <p>Łączny koszt prac to ponad 1,9 mln zł, z czego 970 tys. zł stanowiło dofinansowanie II i III etapu ze środków UE w ramach projektu „Rozwój Transgranicznych Inicjatyw Społecznych” z Programu Współpracy V-A Litwa – Polska 2017 – 2018. W projekcie unijnym realizowane były również tzw. działania miękkie, m.in. szkolenia, wizyty studyjne, warsztaty, spotkania z logopedą i prawnikiem, a także zajęcia z integracji sensorycznej i trening umiejętności społecznej.</p> <p>Łączna wartość przedsięwzięć nieinwestycyjnych to kwota ponad 618 tys. zł.</p> |
| 11. | Aktywna integracja (schemat A) | Gmina Miasto Ełk, MOPS we współpracy z organizacją pozarządową | <p>Projekt nierealizowany</p> <p>Działania założone w tym projekcie były realizowane w projektach z zakresu usług społecznych i projektach aktywizacyjnych m.in. „Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt ZIT”, „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia”.</p> <p>Realizacja kilku projektów rewitalizacyjnych w tym samym czasie i na tym samym obszarze powoduje poważne ograniczenia dla wdrażania nowych przedsięwzięć. Beneficjent proponuje usunięcie projektu z programu w ramach aktualizacji dokumentu.</p> |

STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

| Lp. | Tytuł projektu | Beneficjent | Stan realizacji |
|-----|--|---|---|
| 12. | Wsparcie ełckich rodzin (schemat A) | Gmina Miasto Ełk we współpracy z MOPS Ełk i organizacją pozarządową | <p>Projekt w trakcie realizacji</p> <p>Celem projektu jest kompleksowe wsparcie ełckich rodzin oraz rozwój usług społecznych przyczyniających się do zmniejszenia przypadków umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.</p> <p>W 2019 r. realizowano następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozpoczęcie realizacji projektu; • rekrutacja uczestników; • diagnoza uczestników; • organizacja warsztatów, zajęć, treningów; • poradnictwo specjalistyczne, konsultacje indywidualne; • praca i animatorów; • realizacja projektów socjalnych i kontraktów socjalnych; • podejmowanie działań na infrastrukturze zrewitalizowanej. <p>Okres realizacji projektu: od 1.01.2019 r. do 30.11.2020 r.</p> <p>Budżet projektu wynosi: 414 787,50 zł, z czego dofinansowanie unijne to 392 787,50 zł (95%). W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 77 699,00 zł.</p> |
| 13. | Świadomi mieszkańcy (schemat A) | Gmina Miasto Ełk we współpracy z MOPS Ełk i organizacją pozarządową | <p>Projekt nierealizowany</p> <p>Działania założone w tym projekcie były realizowane w projektach z zakresu usług społecznych i projektach aktywizacyjnych m.in. „Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt ZIT”, „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia”.</p> <p>Realizacja kilku projektów rewitalizacyjnych w tym samym czasie i na tym samym obszarze powoduje poważne ograniczenia dla wdrażania nowych przedsięwzięć. Beneficjent proponuje usunięcie projektu z programu w ramach aktualizacji dokumentu.</p> |
| 14. | Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego | Powiat Ełcki | <p>Projekt zrealizowany</p> <p>Na przeprowadzenie tej inwestycji Powiat Ełcki pozyskał dofinansowanie z instrumentu ZIT bis Ełk (Działanie 8.3 RPO WiM 2014-2020). Wartość prac modernizacyjnych i adaptacyjnych to 0,87 mln zł, a wsparcie UE wyniosło 0,66 mln zł. Projekt zakończył się w 2018 r.</p> |

STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

| Lp. | Tytuł projektu | Beneficjent | Stan realizacji |
|-----|---|--|---|
| | Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku | | <p>Podczas realizacji projektu wykonano prace architektoniczno - konstrukcyjne, elektryczne, sanitarne oraz montaż windy. Zaadaptowano zdegradowane poddasze na cele społeczne. Otwartą dotychczas przestrzeń podzielono na kilka pomieszczeń, wybudowano łazienkę dla osób z niepełnosprawnościami, doświetlono poddasze poprzez montaż okien dachowych. Jedną z nieużytkowanych klatek schodowych przebudowano na szyb windowy, jednocześnie zachowując zabytkowy charakter budynku. Dodatkowo zakupiono wyposażenie niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności adaptowanej do celów społecznych przestrzeni budynku, takie jak meble i sprzęt elektroniczny.</p> <p>Inwestycja znacznie wpłynie na podniesienie liczby oraz dostępności świadczonych usług społecznych. Nowo powstałe sale terapeutyczne umożliwią zarówno wysoką jakość prowadzenia pracy grupowej, jak i indywidualnej. Prowadzone w komfortowych warunkach poradnictwo z psychologiem, doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym stanowić będzie cenny element w procesie aktywizacji społecznej oraz zawodowej podopiecznych PCPR. Podniesienie jakości wyżej wymienionych usług społecznych przyczyni się do rozwoju kompetencji wychowawczych, społecznych, interpersonalnych i zawodowych podopiecznych PCPR oraz umożliwi integrację ze środowiskiem lokalnym.</p> |
| 15. | Razem przeciw wykluczeniu społecznemu (schemat A) | Powiat Ełcki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | <p>Projekt zrealizowany</p> <p>Powiat Ełcki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2019 r. zrealizował projekt pt. „Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków RPO WiM lata 2014-2020. Wsparciem objęto 25 osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego - zamieszkujących obszar „Śródmieście”.</p> <p>Głównym celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu wychowanków pieczy zastępczej oraz członków ich rodzin poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych. Wsparcie ukierunkowane było przede wszystkim na kształtowanie postaw prospołecznych i odpowiedzialnego rodzicielstwa poprzez rozwój kompetencji życiowych, społecznych oraz zawodowych, umiejętności do pełnienia ról społecznych, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, wsparcie samodzielności. Beneficjenci objęci zostali specjalistycznym wsparciem psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego. Uczestniczyli</p> |

STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

| Lp. | Tytuł projektu | Beneficjent | Stan realizacji |
|-----|--|--|--|
| | | | w warsztatach, treningach, Szkole Dla Rodziny, grupie wsparcia, wyjazdach integracyjno-aktywizacyjnych. Łączna wartość projektu: 121 170,00 zł, dofinansowanie projektu z UE: 101 843,25 zł. |
| 16. | Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku | Gmina Miasto Ełk/Muzeum Historyczne w Ełku | Projekt w trakcie realizacji W 2018 roku zakończyły się prace związane z remontem zabytkowego budynku stacyjnego, w którym obecnie swoją siedzibę ma Muzeum Historyczne w Ełku. Zrealizowany został również II etap przedsięwzięcia - utworzenie na terenie EKW Parku Odkrywców Kolei. Na terenie parku zostały zainstalowane urządzenia, które pozwolą w prosty sposób pokazać zasady fizyki, które wykorzystywane są w pracy kolei wąskotorowej. III etap przedsięwzięcia zakłada budowę nowej siedziby muzeum wraz z placem muzealnym. Realizacja III etapu uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. |
| 17. | Dziedzictwo Mazur | Gmina Miasto Ełk/Muzeum Historyczne w Ełku | Projekt w trakcie realizacji W ramach przedsięwzięcia w 2019 r. zostały przeprowadzone: <ul style="list-style-type: none"> • remont lokomotywy Lyd-1 214; • remont i przebudowa przystanku w Sypitkach – II etap; • remont wiaduktu kolejowego na odcinku Laski Małe – Sypitki; • budowa placu zabaw na stacji w Sypitkach. Na realizację powyższych działań wydano 1 013 450,19 zł. Projekt ma charakter ciągły. |
| 18. | Prace renowacyjne w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku | Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku | Projekt w trakcie realizacji Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku uzyskała dofinansowanie UE na realizację projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Ełku poprzez prace konserwacyjne w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego”. Projekt obejmuje następujące prace inwestycyjne: <ul style="list-style-type: none"> • wymiana dachu; • remont zakrystii; • odrestaurowanie zabytkowych organów; • zakup i instalacja sprzętu nagłośnieniowego i umożliwiającego prowadzenie transmisji live w internecie. |

STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

| Lp. | Tytuł projektu | Beneficjent | Stan realizacji |
|-----|---|--|---|
| | | | Całkowita wartość projektu wynosi 1 927 329,00 zł, a wysokość wsparcia finansowego z instrumentu ZIT bis Ełk RPO WiM 2014-2020 to 1 474 406,68 zł. W 2019 r. nie poniesiono kosztów związanych z realizacją projektu. Planowany termin zakończenia prac to 2021 r. |
| 19. | Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego | Gmina Miasto Ełk | <p>Projekt zrealizowany</p> <p>Projekt zakładał kontynuację zagospodarowywania terenu przy rzece Ełk u zbiegu ulic Parkowej i Wojska Polskiego – kolejnych etapów Parku Kopernika. Realizacja inwestycji nastąpiła w 2018 r. Zbudowano ciąg pieszo-rowerowy łączący ul. Wojska Polskiego z promenadą oraz stalową kładkę pieszą przez rzekę Ełk wraz z montażem iluminacji. Przeprowadzona została regulacja brzegów rzeki - oczyszczenie i odmulenie dna oraz wykonanie umocnień. Pojawił się taras wypoczynkowy, ławki parkowe, stoły piknikowe, nowe oświetlenie terenu i nasadzenia. Cały obszar został zagospodarowany zielenią.</p> <p>Koszt projektu wyniósł ok. 5,47 mln zł, a 3,39 mln zł pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.</p> <p>Z kolei etap V był częścią projektu pn. „Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku”, opisanego szerzej w pkt. 3.</p> |
| 20. | Centrum Aktywności Seniorów | Gmina Miasto Ełk we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku | <p>Projekt w trakcie realizacji</p> <p>Na początku 2018 roku otwarty został Klub Seniora „Senior+”. Mieści się on na parterze budynku przy ul. Piłsudskiego 10. Placówka powstała dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.</p> <p>W ubiegłym roku w Klubie Seniora nie był realizowany projekt rewitalizacyjny, czyli skierowany w całości do osób starszych z obszaru rewitalizacji. Prowadzane zajęcia i warsztaty miały charakter ogólnomiejski.</p> |
| 21. | Rewaloryzacja budynku Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku | Powiat Ełcki/ Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku | <p>Projekt w trakcie realizacji</p> <p>W 2018 roku przeprowadzono remont elewacji budynku od strony południowej. Na ten cel przeznaczono 115 tys. zł.</p> |

STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

| Lp. | Tytuł projektu | Beneficjent | Stan realizacji |
|-----|--|--|---|
| 22. | Zagospodarowanie terenu i zieleni Ełckiego Centrum Kultury | Ełckie Centrum Kultury | <p>Projekt w trakcie realizacji</p> <p>Ełckie Centrum Kultury uzyskało dofinansowanie unijne (ZIT bis Ełk) na realizację projektu zakładającego budowę sali kameralnej oraz utworzenie parku muzycznego. Teren między budynkiem Ełckiego Centrum Kultury a ulicą Zamkową zostanie zagospodarowany pod park muzyczny. W parku pojawi się niewielka scena – na koncerty, potańcówki itp. oraz plenerowe instrumenty muzyczne (bębny, dzwony) i zabawki (linarium, labirynt i in.).</p> <p>Z kolei sala kameralna będzie połączona z głównym budynkiem ECK. Będzie to sala wielofunkcyjna – teatralna, koncertowa, filmowa, warsztatowa, konferencyjna i, w zależności od funkcji, pomieści od 80 do 150 osób. Zakupione wyposażenie (m.in. składane trybuny, nagłośnienie) pozwoli w pełni wykorzystać potencjał pomieszczenia. W holu pojawi się również dodatkowa powierzchnia wystawiennicza.</p> <p>W listopadzie 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji. Ma ona zostać ukończona latem/jesienią 2020 r. Wartość projektu to 8,05 mln zł, a dofinansowanie unijne wynosi 6,01 mln zł. Poniesione koszty w 2019 r. to 4 057 818,76 zł, w tym dofinansowanie UE – 3 138 256,70 zł, wkład własny – 919 562,06 zł.</p> |
| 23. | Zadaszenie amfiteatru Ełckiego Centrum Kultury | Ełckie Centrum Kultury | Projekt nierealizowany |
| 24. | Wielopokoleniowa integracja społeczna | Rzymskokatolicka Parafia NSJ w Ełku/Akcja Katolicka im. Św. Stanisława Kazimierczyka | <p>Projekt w trakcie realizacji</p> <p>W 2019 r. nie były prowadzone działania w ramach projektu.</p> |
| 25. | Przeciwdziałanie marginalizacji osób bezdomnych | Dom dla osób bezdomnych i najuboższych Monar-Markot w Ełku | Projekt nierealizowany |

STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

| Lp. | Tytuł projektu | Beneficjent | Stan realizacji |
|-----|---|---------------------------------|---|
| 26. | Termomodernizacja budynku przy ul. Chopina 23 | Administrator sp. z o.o. w Ełku | <p>Projekt w trakcie realizacji</p> <p>W 2019 r. w budynku dokonano remontu dachu. Zakres prac obejmował wymianę pokrycia z dachówki ceramicznej, przemurowanie kominów z cegły klinkierowej, zwieńczenie docieplenia obróbkami blacharskimi.</p> <p>Wartość inwestycji wyniosła 155 999,95 zł, w tym dotacja z budżetu miasta w wysokości 45 000,00 zł.</p> |
| 27. | Termomodernizacja budynku przy ul. Gdańskiej 22/24 | Administrator sp. z o.o. w Ełku | <p>Projekt zrealizowany</p> <p>Projekt zrealizowany w 2016 r. Inwestycja polegała na remoncie elewacji z dociepleniem. Zakres prac obejmował wykonanie docieplenia styropianem z kolorystyczną wyprawą elewacyjną, zwieńczenie docieplenia obróbkami blacharskimi, remont balkonów, wymianę okienek piwnicznych. Koszt prac wyniósł 189 tys. zł.</p> |
| 28. | Termomodernizacja budynku przy ul. Orzeszkowej 14A | Administrator sp. z o.o. w Ełku | <p>Projekt zrealizowany</p> <p>Projekt zrealizowany w 2016 r. Wykonano remont elewacji z dociepleniem (docieplenie ścian styropianem, wykonanie kolorystycznej wyprawy elewacyjnej, wymiana podokienników, remont balkonów). Na realizację inwestycji przeznaczono 225 tys. zł.</p> |
| 29. | Termomodernizacja budynku przy ul. Gdańskiej 2/Mickiewicza 21 | Administrator sp. z o.o. w Ełku | <p>Projekt zrealizowany</p> <p>Projekt zrealizowany w 2016 r. W ramach inwestycji docieplono strop ostatniej kondygnacji, wymieniono część pokrycia dachu, wykonano docieplenie ścian styropianem wraz z kolorystyczną wyprawą elewacyjną, dokonano zwieńczenia docieplenia obróbkami blacharskimi. Całkowita wartość przeprowadzonych prac wyniosła 340 tys. zł.</p> |
| 30. | Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 37 i 39 | Administrator sp. z o.o. w Ełku | <p>Projekt w trakcie realizacji</p> <p>W 2016 r. w ramach projektu dokonano remontu elewacji frontowej z dociepleniem. Zakres prac obejmował docieplenie ściany frontowej styropianem z wykonaniem kolorystycznej wyprawy elewacyjnej, docieplenie bram wjazdowych, wymianę podokienników oraz remont balkonów. Koszt inwestycji to 191 tys. zł.</p> <p>W 2019 r. nie prowadzono prac termomodernizacyjnych budynku.</p> |

STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

| Lp. | Tytuł projektu | Beneficjent | Stan realizacji |
|-----|---|----------------------------------|--|
| 31. | Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 24 | Administrator sp. z o.o. w Ełku | Projekt w trakcie realizacji W poprzednim roku przeprowadzono część działań przewidzianych w projekcie. Wykonano remont elewacji od strony klatek schodowych z dociepleniem i wykonaniem kolorystycznej wyprawy elewacyjnej. Całkowita wartość przeprowadzonych prac wyniosła ok. 187 tys. zł. W 2019 r. nie prowadzono prac termomodernizacyjnych budynku. |
| 32. | Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 33A | Administrator sp. z o.o. w Ełku | Projekt w trakcie realizacji Wspólnota Mieszkaniowa w 2018r. zrealizowała remont pokrycia dachowego oraz docieplenia budynku w poziomie ostatniej kondygnacji. W 2019 r. nie prowadzono prac termomodernizacyjnych budynku. |
| 33. | Termomodernizacja budynku przy ul. Gdańskiej 20 | Administrator sp. z o.o. w Ełku | Projekt w trakcie realizacji W 2019 r. Gmina Miasto Ełk otrzymała dofinansowanie ze środków RPO WiM 2014-2020 na termomodernizację budynku. Zakres prac obejmuje m.in. podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowę węzła oraz instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych od wewnątrz; docieplenie dachu i stropu piwnicy, wymianę okien i drzwi zewnętrznych na stolarkę energooszczędną. Wartość projektu to 560 071,67 zł, w tym dofinansowanie UE w kwocie 405 180,98 zł. |
| 34. | Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 38A | Administrator sp. z o.o. w Ełku | Projekt w przygotowaniu W 2018 r. przygotowana została dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku. |
| 35. | Termomodernizacja budynku przy ul. Orzeszkowej 16, 18 | Administrator sp. z o.o. w Ełku | Projekt nierealizowany |
| 36. | Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 34 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” | Projekt w trakcie realizacji W 2018 r. wykonano docieplenie ściany budynku. Koszt prac wyniósł 219 tys. zł. W ubiegłym roku nie prowadzono prac termomodernizacyjnych. |

STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

| Lp. | Tytuł projektu | Beneficjent | Stan realizacji |
|-----|--|----------------------------------|---|
| 37. | Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 36 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” | Projekt zrealizowany Projekt zrealizowany w 2016 r. Inwestycja polegała na dociepleniu ściany podłużnej południowej oraz wymianie podłóży betonowych w loggiach. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 150 tys. zł. |
| 38. | Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 1 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” | Projekt zrealizowany W 2017 r. roku ocieplono ścianę podłużną południową i wymieniono podłóża betonowe balkonów. Na inwestycję wydano 117 tys. zł. |
| 39. | Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 3 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” | Projekt w przygotowaniu W 2020 r. planowany jest remont ściany podłużnej wschodniej wraz z dociepleniem. |
| 40. | Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 9 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” | Projekt zrealizowany W 2018 r. dokonano docieplenia ściany i wymiany podłóży betonowych na balkonach. Koszt inwestycji wyniósł ok. 298 tys. zł. |
| 41. | Termomodernizacja budynku przy ul. Gdańskiej 6 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” | Projekt w przygotowaniu W ubiegłym roku nie prowadzono prac termomodernizacyjnych. |
| 42. | Termomodernizacja budynku przy ul. Gdańskiej 10 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” | Projekt w przygotowaniu W ubiegłym roku nie prowadzono prac termomodernizacyjnych. |
| 43. | Termomodernizacja budynku przy ul. Gdańskiej 12 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” | Projekt w trakcie realizacji W 2015 r. przeprowadzono remont elewacji z dociepleniem ścian od strony klatek schodowych V-VII . Na inwestycję wydano 126 tys. zł. W ubiegłym roku docieplono ściany balkonów (IV-V klatka) wraz z remontem podłóży na balkonach (138 220,00 zł). |
| 44. | Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 7 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” | Projekt zrealizowany W 2018 r. zrealizowano docieplenie ściany i wymiany podłóży betonowych na balkonach. Koszt prac wyniósł prawie 273 tys. zł. |

STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

| Lp. | Tytuł projektu | Beneficjent | Stan realizacji |
|-----|--|---|--|
| 45. | Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 9A | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” | Projekt w trakcie realizacji W 2015 r. docieplono ściany od strony klatek schodowych (pod tarasem). Na inwestycję wydano 27 tys. zł. W ubiegłym roku nie prowadzono prac termomodernizacyjnych. |
| 46. | Prace rewitalizacyjne w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej w Ełku | Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej | Projekt w trakcie realizacji |
| 47. | Przebudowa i adaptacja poddasza nad Szkołą Podstawową nr 2 | Gmina Miasto Ełk, Międzyszkolny Klub Sportowy „Żak”, Szkoła Podstawowa nr 2 | Projekt nierealizowany W 2017 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej. W trakcie realizacji zamówienia wykonawca wskazał, że konieczne jest dodatkowe wzmocnienie konstrukcji budynku, przedstawiając wstępny koszt realizacji takiej inwestycji. Koszt ten (szacunkowo w granicach 7.000.000,00 zł brutto) nie był możliwy do poniesienia przez Gminę Miasto Ełk. W związku z powyższym podjęta została decyzja o odstąpieniu od sporządzenia dokumentacji. |
| 48. | To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce | Fundacja „Human Lex Instytut” | Projekt w trakcie realizacji Podjęte zostały działania w postaci pracy streetowrkerów, animatorów, wychowawców, psychologa środowiskowego i terapeuty w zdiagnozowanych miejscach obszaru rewitalizacji. W główne działania projektu są włączeni rodzice i lokalna społeczność, jako liderzy lokalni, oraz osoby wspierające i decyzyjne w związku z prowadzonymi elementami animacyjnymi, psychospołecznymi i zawodowymi. W ramach projektu zorganizowano obóz, piknik rodzinny, wyjazdy kulturalne i zajęcia terapeutyczne. Podsumowaniem projektu będzie wydarzenie profilaktyczne, zaplanowane na 2020 r., na którym wszystkie grupy zaprezentują swoje dokonania artystyczne i kulturalne. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE w ramach instrumentu ZIT bis Ełk RPO WiM 2014-2020 w kwocie 380 tys. zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 122 849 zł. |

STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

| Lp. | Tytuł projektu | Beneficjent | Stan realizacji |
|-----|--|---|--|
| 49. | Renowacja zabytkowego budynku kościoła oraz otoczenia | Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów | <p>Projekt w trakcie realizacji</p> <p>W okresie sprawozdawczym trwały prace inwestycyjne polegające na wymianie ogrodzenia posesji, utworzeniu placu zabaw, wykonaniu iluminacji budynku kościoła, adaptacji i modernizacji budynku zborowego na Chrześcijańskie Centrum Wsparcia Rodziny (wykonano 25% prac). Projekt „Rewitalizacja obiektów Kościoła Baptystycznego w Ełku wraz z otoczeniem” otrzymał dofinansowanie ze środków UE w ramach instrumentu ZIT bis Ełk RPO WiM 2014-2020.</p> <p>Wartość całego projektu wynosi 2,57 mln zł, a wartość dofinansowania 1,97 mln zł. W ubiegłym roku na realizację inwestycji wydano 724 700,44 zł.</p> |
| 50. | Szkoła przedsiębiorczości | Stowarzyszenie Adelfi | <p>Projekt nierealizowany</p> |
| 51. | Zagospodarowanie skweru im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” przy ul. Słowackiego | Gmina Miasto Ełk | <p>Projekt w przygotowaniu</p> <p>Inwestycja ma sporządzoną koncepcję zagospodarowania i dokumentację projektową wraz pozwoleniem na budowę. Proces uzgadniania zakresu inwestycji był uspołeczniony – przeprowadzono konsultacje społeczne metodą planowania w przestrzeni oraz organizowano spotkania konsultacyjne w celu wyboru odpowiedniego wariantu i jego dopracowania. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi ok. 2,65 mln zł.</p> |
| 52. | Modernizacja i przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku | Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku | <p>Projekt w przygotowaniu</p> <p>Przygotowana jest koncepcja modernizacji i przebudowy biblioteki oraz dokumentacja techniczna.</p> |
| 53. | Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację | Gmina Miasto Ełk | <p>Projekt zrealizowany</p> <p>Koncepcja Gminy Miasta Ełk otrzymała dofinansowanie w konkursie „Modelowa rewitalizacja miast”, organizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Ełk razem z 19 innymi miastami z całego kraju był organizatorem modelowych działań rewitalizacyjnych, służących</p> |

STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

| Lp. | Tytuł projektu | Beneficjent | Stan realizacji |
|-----|--|------------------|--|
| | | | <p>za przykład dla innych samorządów. Projekt trwał od 1 lipca 2016 r. do 31 października 2018 r.</p> <p>Ideą projektu było wypracowanie uniwersalnego i skutecznego modelu działań w zakresie ożywienia Śródmieścia Ełku, w celu zastopowania negatywnych zjawisk występujących w tym obszarze. W ramach projektu realizowane były m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsultacje społeczne aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku; • Warsztaty kompetencji streetworkera (pedagoga ulicy); • Młodzieżowa Akademia Rewitalizacji (warsztaty dla dzieci i młodzieży); • Inicjatywy w ramach Programu Sąsiedzkiego (dofinansowanie miniprojektów-pomysłów mieszkańców; • Polityka funkcjonalna Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej; • Programy aktywizacji zawodowej mieszkańców Śródmieścia; • Inwentaryzacja nieruchomości w Śródmieściu; • Koncepcje architektoniczno-urbanistyczne wybranych obszarów w Śródmieściu; • Dokumentacja techniczna dla wybranych przedsięwzięć; • Działania edukacyjne z zakresu rewitalizacji. <p>Wartość projektu wyniosła 755 809,09 zł (dofinansowanie UE – 612 205,32 zł, budżet państwa – 68 022,81 zł, budżet miasta Ełk – 75 580,96 zł).</p> |
| 54. | Zagospodarowanie terenu pomiędzy rzeką Ełk a ul. Żeromskiego | Gmina Miasto Ełk | <p>Projekt w trakcie realizacji</p> <p>Na terenie skweru pomiędzy rzeką Ełk a ul. Żeromskiego zostały przeprowadzone w 2017 r. konsultacje społeczne metodą planowania w przestrzeni. W spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział ok. 100 mieszkańców ełckiego Śródmieścia i innych części miasta, którzy korzystają z tego terenu (np. placu zabaw). Seniorzy, dorośli, młodzież i dzieci przekazali wiele pomysłów związanych z tym, jak skwer mógłby wyglądać w przyszłości. Na podstawie propozycji mieszkańców powstała koncepcja zagospodarowania, której wizualizacja znajduje się w rozdziale 3. sprawozdania.</p> <p>Część planów zagospodarowania terenu została wykonana w 2018 r. w postaci ścieżki rowerowej biegnącej do ul. Żeromskiego i Placu Katedralnego (inwestycja opisana w projekcie nr 3. „Zagospodarowanie pustych przestrzeni dla rozwoju funkcji turystyczno – rekreacyjnych</p> |

STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

| Lp. | Tytuł projektu | Beneficjent | Stan realizacji |
|-----|--|------------------|--|
| | | | <p>w mieście Ełk”). Dokonano również nasadzeń drzew wzdłuż brzegu rzeki Ełk na odcinku od ul. Wojska Polskiego do mostu pieszo-rowerowego.</p> <p>W 2019 r. nie prowadzono działań inwestycyjnych na terenie skweru.</p> |
| 55. | Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku | Gmina Miasto Ełk | <p>Projekt w trakcie realizacji</p> <p>W 2019 r. przygotowano dokumentację techniczną (w oparciu o wyniki konsultacji społecznych) oraz pozyskano dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków RPO WiM 2014-2020 (ZIT bis Ełk).</p> <p>Zmodernizowany budynek będzie przeznaczony do celów społecznych na potrzeby działalności organizacji pozarządowych, instytucji kultury oraz mieszkańców Ełku. Za udostępnianie pomieszczenia nie będą pobierane opłaty. W głównej części budynku znajdzie się otwarta sala ze sceną. Antresola będzie mieściła pomieszczenia biurowe i salę konferencyjną. Przewidziane jest zakupienie wyposażenia (m.in. meble, sprzęt nagłośnieniowy, projektor, sprzęt komputerowy).</p> <p>Wartość projektu wynosi 2 764 214,87 zł, w tym dofinansowanie UE 2 114 624,38 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 234 958,26 zł, wkład z budżetu miasta Ełku 414 632,23 zł.</p> |

2. Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźników sytuacji społeczno-gospodarczej, tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione, prowadzona jest dla obszaru rewitalizacji „Śródmieście”, jak i całego Ełku. Wynika to z przyjętej przez Ministerstwo Rozwoju metodologii wyznaczania obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. Zgodnie z nią, **za negatywne zjawisko uznaje się sytuację, gdy dany miernik wskazuje na niski poziom rozwoju lub dokumentuje silną dynamikę spadku poziomu rozwoju w odniesieniu do wartości referencyjnej dla całego miasta.** Takie podejście umożliwi ocenę, czy i w jakim stopniu sytuacja w obszarze rewitalizacji ulega poprawie. Część wskaźników jest przedstawiana jedynie dla Śródmieścia bądź dla całego Miasta (gdy niemożliwe lub niecelowe jest pozyskanie danych wyłącznie dla obszaru rewitalizacji).

W tabelach zostały zaprezentowane dane wyjściowe określone na etapie sporządzania programu¹, dane za lata obowiązywania programu oraz wartości docelowe, które mają zostać osiągnięte na koniec 2023 r. Przy wskaźnikach wykorzystanych w diagnozie programu do wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, porównujących sytuację w Śródmieściu do średniej miejskiej, zaznaczono:

- **Kolorem zielonym** – stan, gdy miernik w danym roku sprawozdawczym wskazuje na wyższy poziom rozwoju Śródmieścia w odniesieniu do średniej dla całego Ełku (niewystępowanie negatywnego zjawiska w danym aspekcie),
- **Kolorem czerwonym** - stan, gdy miernik w danym roku sprawozdawczym wskazuje na niższy poziom rozwoju Śródmieścia w odniesieniu do średniej dla całego Ełku (występowanie negatywnego zjawiska w danym aspekcie).

Dodatkowo w systemie monitorowania uwzględniono **wskaźniki mierzące skalę i efekty projektów rewitalizacyjnych**, gdzie źródłem danych są beneficjenci tych projektów. Wartości tych wskaźników nie należy więc utożsamiać z ogółem działań podejmowanych w obszarze rewitalizacji w danym roku – odnoszą się one wyłącznie do przedsięwzięć zapisanych w programie.

Liczba ludności obszaru rewitalizacji „Śródmieście”, wg zameldowań, na koniec 2019 r. wyniosła 15 667 i zmniejszyła się wobec 2018 r. o 295 osób. W całym mieście liczba zameldowanych mieszkańców zmalała o 73.

Tabela 1 Liczba osób zameldowanych na koniec 2019 r. (zameldowania czasowe i stałe, źródło: Urząd Miasta Ełku, Referat Spraw Obywatelskich).

| Śródmieście | Ełk |
|-------------|-------------|
| 15 667 osób | 59 189 osób |

¹W zależności od typu danych były to wartości za 2014 r. lub 2015 r. W przypadku danych w celu 6 przyjęto wartości bazowe (2013 r.) i wartości docelowe, ustalone w dokumencie „Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r.” (tzw. program niskoemisyjny), w celu zachowania spójności pomiędzy oboma programami.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Tabela 2 Wskaźniki celu 1 „Zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości”.

| Cel 1 – Zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości. | | | | | | | | | |
|--|---------|---|----------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|------------|
| Nazwa wskaźnika | Miernik | Źródło Informacji | Śródmieście | | | | | | Miasto Ełk |
| | | | Wartość bazowa | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | Wartość docelowa (2023 r.) | 2019 r. |
| Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców (w danym roku) | szt. | Urząd Miasta Ełku, Wydział Organizacyjny, Referat Działalności Gospodarczej | 6,62 | 6,32 | 6,72 | 7,12 | 7,46 | 7,95 | 5,91 |
| Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 100 mieszkańców (w danym roku) | osoby | Powiatowy Urząd Pracy | 5,55 | 4,30 | 3,49 | 3,38 | 2,81 | 4,44 | 1,34 |
| Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym na 100 mieszkańców (w danym roku) | osoby | Powiatowy Urząd Pracy | 2,44 | 0,73 | 1,91 | 1,81 | 2,30 | 1,95 | 0,90 |
| Liczba powstałych przedsiębiorstw społecznych (narastająco) | szt. | beneficjenci projektów wpisanych do Programu | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | nd |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem objętych wsparciem w ramach projektów dot. aktywizacji zawodowej (narastająco) | osoby | beneficjenci projektów wpisanych do Programu | nd | 0 | 0 | 32 | 164 | 480 | |
| Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w ramach projektów dot. aktywizacji zawodowej (narastająco) | osoby | beneficjenci projektów wpisanych do Programu | nd | 0 | 0 | 0 | 31 | 41 | |


Komentarz – wskaźniki celu 1

Cel 1 „Zwiększenie zatrudnienia i przedsiębiorczości” zakłada m.in.:

- aktywne działania skierowane do osób długotrwale pozostających bez pracy w celu poprawy możliwości znalezienia zatrudnienia;
- rozwój przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej.

Analiza wskaźników celu 1 wskazuje, że liczba długotrwale bezrobotnych mieszkających w Śródmieściu wynosiła na koniec 2019 r. 441 osób i zmniejszyła się wobec 2018 r. o 99 osób. Osoby długotrwale bezrobotne z obszaru rewitalizacji stanowią ponad połowę (55,5%) tej grupy osób w Ełku (wzrost o 7,7 punktów procentowych). Negatywnym zjawiskiem jest wzrost liczby osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym, zamieszkujących Śródmieście. W ciągu roku w rejestrze bezrobotnych przybyły 72 takie osoby. Łącznie było ich 361 osób, co stanowiło aż 67,5% wartości dla całego Ełku.

Tabela 3 Dane dot. osób bezrobotnych w Ełku. (źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ełku).

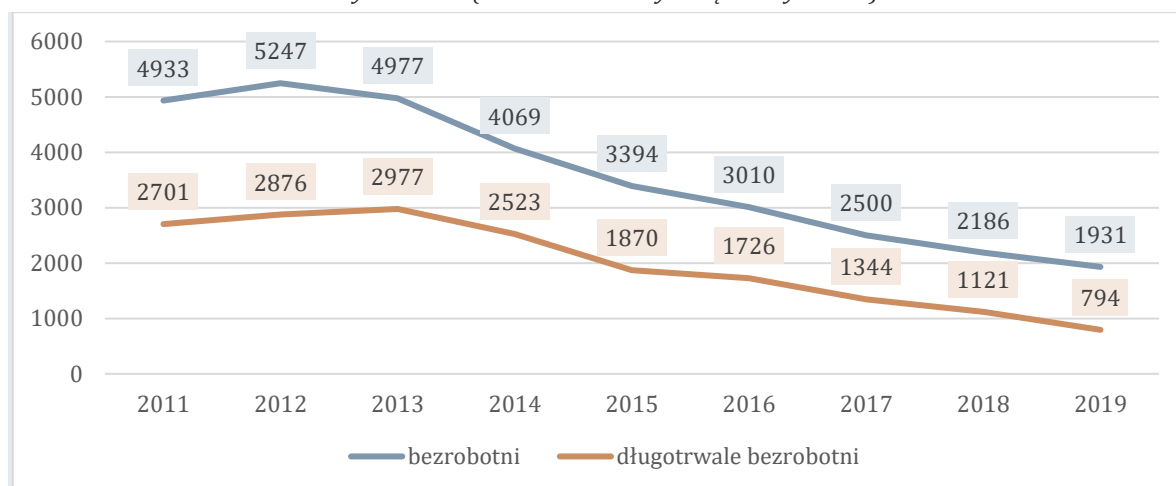

Należy zaznaczyć, że mimo ogólnej poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy, **wskaźniki dla obszaru rewitalizacji Śródmieście są gorsze od średnich wartości dla miasta**. Oznacza to, że nadal mamy do czynienia z negatywnym zjawiskiem w tym aspekcie. Zaplanowane w programie projekty z zakresu aktywizacji zawodowej (a także projekty ogólnomiejskie) są w trakcie realizacji i na ich efekty należy jeszcze poczekać. Trzeba przy tym zaznaczyć, że wartości wskaźników dot. liczby osób objętych wsparciem w zakresie aktywizacji zawodowej mogą być mniejsze niż założono w programie. Poprawa sytuacji na rynku pracy powoduje, że krąg osób kwalifikujących się do udziału w projektach z roku na rok maleje. Z drugiej strony nie są jeszcze znane skutki obostrzeń gospodarczych związanych z epidemią koronawirusa. Być może skutkiem epidemii będzie wzrost bezrobocia, poprzez co krąg potencjalnych uczestników projektów może się zwiększyć.

Powrót mieszkańców Śródmieścia na rynek pracy jest również uwarunkowany dysponowaniem odpowiedniej infrastruktury do przeprowadzenia tego procesu. W ubiegłym roku działalność rozpoczęło Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia” (ul. Kościuszki 27A), w której są realizowane projekty aktywizujące zawodowo mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Poziom przedsiębiorczości w obszarze rewitalizacji, mierzony liczbą podmiotów gospodarczych, wzrósł kolejny rok z rzędu i utrzymuje się na wyższym poziomie niż ogólnie w Ełku. Na koniec zeszłego roku w Śródmieściu zarejestrowanych było 1 168 podmiotów gospodarczych (1/3 firm z Ełku zarejestrowanych w CEIDG). W ciągu roku wśród mieszkańców śródmieścia pojawiło się 32 nowych przedsiębiorców.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

| Cel 2 – Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych. | | | | | | | | | |
|---|---------|--|----------------|---------|---------|---------|-------------|----------------------------|------------|
| Nazwa wskaźnika | Miernik | Źródło Informacji | Śródmieście | | | | | | Miasto Ełk |
| | | | Wartość bazowa | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | Wartość docelowa (2023 r.) | 2019 r. |
| Liczba ofiar przemocy w rodzinie na 100 mieszkańców (w danym roku) | osoby | Komenda Powiatowa Policji w Ełku | 0,15 | 0,70 | 0,45 | 0,38 | 0,41 | 0,12 | 0,32 |
| Osoby, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców (w danym roku) | osoby | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku | 5,69 | 4,10 | 4,37 | 2,75 | 2,62 | 4,56 | 1,60 |
| Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (narastająco) | osoby | beneficjenci projektów wpisanych do Programu | nd | 0 | 0 | 57 | 269 | 1 200 | nd |
| Liczba dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (narastająco) | osoby | beneficjenci projektów wpisanych do Programu | nd | 0 | 0 | 32 | 123 | 500 | |
| Liczba osób starszych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (narastająco) | osoby | beneficjenci projektów wpisanych do Programu | nd | 0 | 0 | 20 | 33 | 250 | |

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

| | | | | | | | | | |
|---|-------|---|----|---|---|----|------------------------|-----|-----------------------|
| Liczba osób z uzależnieniami zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (narastająco) | osoby | beneficjenci projektów wpisanych do Programu | nd | Dane dot. osób uzależnionych są informacją wrażliwą, niemożliwą do pozyskania w ramach projektów. W związku z tym wskaźnik nie może być monitorowany. | | | | 350 | |
| Liczba osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (narastająco) | osoby | beneficjenci projektów wpisanych do Programu | nd | 0 | 0 | 3 | 30 | 100 | |
| Liczba podjętych/wspartych inicjatyw lokalnych (narastająco) | szt. | Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku; beneficjenci projektów wpisanych do Programu | nd | 6 | 9 | 10 | 39 (w 2019 r. - 29) | 80 | 33 (w 2019 r. - 8) |

Komentarz – wskaźniki celu 2


W celu 2 dąży się do włączenia społecznego grup dotkniętych różnego rodzaju problemami i całych rodzin poprzez podjęcie zróżnicowanych przedsięwzięć w zakresie aktywnej integracji, które umożliwią zmianę dotychczasowego sposobu życia poszczególnym osobom i całym społecznościom. W odniesieniu do głównych wskaźników, mierzących sytuację w Śródmieściu i porównując ją do średniej miejskiej, po 2 latach poprawy zaobserwowano niewielkie nasilenie zjawiska przemocy. Wg danych Komendy Powiatowej Policji w Ełku, w obszarze rewitalizacji **przemocą w rodzinie** dotkniętych były 64 osoby (+3 rok do roku), co stanowi nieco ponad 1/3 wszystkich takich przypadków w Ełku. W całym mieście liczba osób dotkniętych przemocą wzrosła o 26 do poziomu 190 osób.

W działania na rzecz walki z przemocą silnie włączyło się ECRS Stajnia, gdzie mieści się Poradnia Rodzinna, Punkt Konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Prześstępstwem. Ponadto w ECRS Stajnia realizowany był projekt „Bezpieczna Przystań” - Miasto Ełk skutecznie przeciw przemocy”. Celem projektu był rozwój istniejącej infrastruktury do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie - utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Realizacja w 2019 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 -2020 wskazuje na kluczową rolę odpowiednich szkoleń skierowanych do osób realizujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy i do innych osób podejmujących w środowiskach lokalnych działania na rzecz ograniczania przemocy w rodzinie. Kompleksowe działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie będą mogły być skuteczne tylko po odpowiednim przygotowaniu przedstawicieli reprezentujących różne grupy zawodowe.

W obszarze rewitalizacji utrzymuje się poprawa wskaźnika dot. **ubóstwa**. W ubiegłym roku z pomocy społecznej, z powodu ubóstwa, skorzystało łącznie w całym mieście 949 osób. Ponad 43% to mieszkańcy Śródmieścia. W porównaniu do 2018 r., liczba osób objętych świadczeniami pomocy społecznej w obszarze, jak i w całym mieście, znacznie spadła. Poprawa sytuacji w Śródmieściu Ełku odznaczała się jednak nieco większą dynamiką (-6,38% rok do roku), dzięki czemu zmniejszył się dystans w stosunku do średniej miejskiej.

Wykres 2 Liczba osób, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej z powodu ubóstwa (źródło: MOPS).



W ubiegłym roku trwała realizacja projektów rewitalizacyjnych ukierunkowanych na wsparcie osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem. W kolejnych latach można spodziewać się systematycznego wzrostu osób ze Śródmieścia, objętych różnego rodzaju pomocą na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej. Sprzyjać temu będzie powstała infrastruktura – zmodernizowane budynki MOPS, PCPR czy też Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia”. W tym miejscu trzeba jednak zaznaczyć, że trudno będzie osiągnąć wartości docelowe założone na 2023 r. Liczba uczestników projektów, objętych usługami w zakresie integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, została oszacowana w 2015 r. na etapie tworzenia programu rewitalizacji. Od tego czasu ma miejsce dynamiczna poprawa sytuacji życiowej mieszkańców Ełku, co przekłada się na to, że coraz mniej osób kwalifikuje się do objęcia wsparciem w ramach poszczególnych projektów rewitalizacyjnych.

W ubiegłym roku w śródmiejskiej przestrzeni przeprowadzono 29 inicjatyw lokalnych, przede wszystkim w ramach projektów współfinansowanych przez UE na rzecz integracji społecznej. Uczestnicy projektu „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia” tworzyli inicjatywy dla Seniorów z Klubu Senior+ w Ełku, m.in. wspólnie uczestniczyli w warsztatach rękodzieła, wpierali osoby bezdomne, brali udział w szkoleniu z pierwszej pomocy, wspierali Kampanię „Biała Wstążka” czy też wraz z animatorem, streetworkerem i pracownikiem socjalnym grupa integrowała się poprzez spacer po obszarze rewitalizacji (pomysłowo zagospodarowane podwórka, skwery, murale),

Rysunek 2 Zdjęcia z inicjatyw lokalnych w projekcie Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia” (źródło: MOPS).



Fundacja Human Lex Instytut przeprowadziła w ramach projektu „To jest moje miejsce bo kocham to miejsce” następujące działania:

- zaprojektowanie przestrzeni w podwórku na ul. Orzeszkowej - zdjęcia z dzieciństwa i wielkoformatowe fotografie na budynkach;
- warsztaty i spotkania ze sławnymi osobami dla rodziców. Elementy edukacji zdrowej żywności i historyczne;
- spotkania rodziców z władzami miasta w celu omówienia możliwości poprawy bezpieczeństwa na ul. Orzeszkowej;
- wydarzenie - Jak kochać To Miejsce.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Rysunek 3 Zdjęcia z inicjatyw lokalnych w projekcie „To jest moje miejsce bo kocham to miejsce (źródło: Human Lex Instytut).



ANALIZA WSKAŹNIKOWA

| Cel 3 – Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych | | | | | | | | | |
|--|---------|--|----------------|----------------|---------|---------|---------|----------------------------|------------------|
| Nazwa wskaźnika | Miernik | Źródło Informacji | Śródmieście | | | | | | Miasto Ełk |
| | | | Wartość bazowa | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | Wartość docelowa (2023 r.) | 2019 r. |
| Osoby, którym zrealizowano świadczenia pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby na 100 mieszkańców (w danym roku) | osoby | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku | 4,17 | 3,42 | 3,96 | 3,23 | 3,64 | 3,33 | 2,11 |
| Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych | szt. | MOPS, Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej, PCPR | nd | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | nd |
| Liczba usług świadczonych przez podmioty wsparte w programie (w danym roku) | szt. | Wydział Polityki Społecznej UM Ełku, MOPS, Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej, PCPR, Klub Seniora „Senior+” | 76 | 76 | 77 | 80 | 81 | 133 | nd |
| Liczba osób świadczących usługi wspierające animację lokalną (animatorzy lokalni, streetworkerzy itp.) – w danym roku | osoby | beneficjenci projektów wpisanych do Programu | 4 | 5 | 25 | 17 | 38 | 15 | nd |
| Nazwa wskaźnika | Miernik | Źródło Informacji | Śródmieście | Miasto Ełk | | | | | |
| | | | | wartość bazowa | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | wartość docelowa |
| Liczba osób, które skorzystały z działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej (w danym roku) | osoby | Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku | nd | 5 748 | 8 720 | 8 950 | 8 795 | 4 658 | 6 438 |
| Liczba osób, które skorzystały z usług społecznych świadczonych przez podmioty wsparte w programie (w danym roku) | osoby | Wydział Polityki Społecznej UM Ełku, MOPS, Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej, PCPR, Klub Seniora „Senior+” | nd | 21 956 | 22 111 | 22 512 | 22 772 | 15 060 | 22 396 |

Komentarz – wskaźniki celu 3


Cel 3 w głównej mierze zakłada **wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za realizację działań z zakresu świadczenia usług społecznych**. W „Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” znalazły się projekty obejmujące przebudowę/modernizację/adaptację budynków następujących instytucji, w których świadczone są lub będą usługi społeczne²:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej.

Wszystkie ww. inwestycje zostały zakończone. Poprawa stanu technicznego budynków ma wpłynąć na polepszenie warunków pracy oraz zwiększenie ilości i jakości oferowanych usług społecznych. Liczba świadczonych usług wrasta powoli, jednak rozpoczęcie działalności przez ECRS „Stajnia” powinno w najbliższych latach zwiększyć tę dynamikę. Usługi dedykowane jedynie dla mieszkańców obszaru rewitalizacji realizowane są przede wszystkim w ramach projektów rewitalizacyjnych.

W 2019 r. w Ełku wzrósł wskaźnik dot. osób, którym zrealizowano świadczenia pomocy społecznej z powodu **długotrwałej choroby**. Wzrost liczby osób, otrzymujących wsparcie z tego powodu, został wygenerowany przede wszystkim przez mieszkańców Śródmieścia (54 osoby z 75). Z obszaru rewitalizacji pochodzi 45,6% wszystkich beneficjentów świadczeń pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby. Dystans w stosunku do średniej miejskiej jest na tyle duży, że nadal w Śródmieściu występuje negatywna sytuacja w tym aspekcie społecznym. Przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi w strukturze demograficznej. Centrum Ełku jest najbardziej zaawansowanym wiekowo obszarem miasta.

Wykres 3 Osoby, którym zrealizowano świadczenia pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby (źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

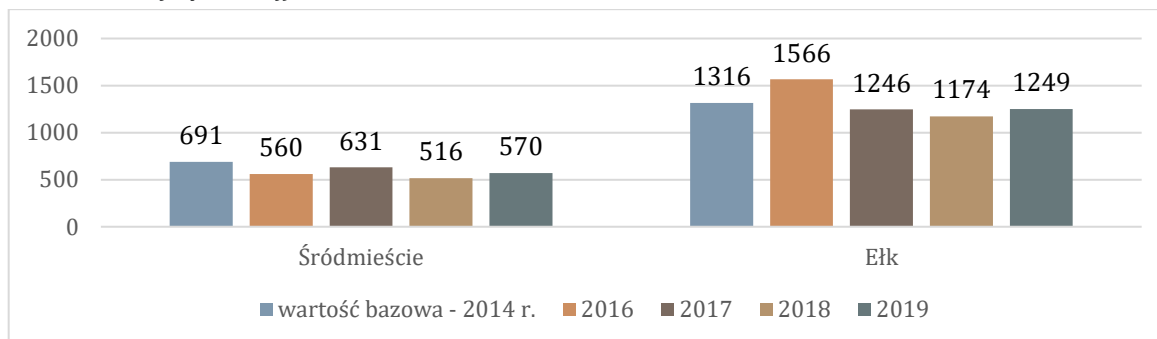

W obszarze rewitalizacji **pracę metodą streetworkingu prowadziło 38 osób**. 31 z nich realizowało zadania w ramach projektów rewitalizacyjnych dofinansowanych z funduszy unijnych. Ponadto działalność streetworkerów finansowana była z budżetu miasta, głównie w formie grantów dla organizacji pozarządowych:

- Human "Lex" Instytut: „Streetworking w Ełku elementem profilaktyki systemowej” - Dzięki realizacji zadania specjalnie dobrani specjaliści mogli poprzez działanie na ulicy nie tylko obserwować i dogłębnie poznać zachowanie młodzieży i dzieci, ale również modyfikować je i proponować alternatywy na utarte schematy działania i myślenia.
- Stowarzyszenie Alternatywa: „SZANSA” - Celem głównym projektu była kontynuacja działań profilaktycznych realizowanych metodą streetworkingu, głównie w środowisku otwartym, oraz działań mających na celu poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, poprzez organizację różnych form aktywności, kół zainteresowań itp.

² Szczegółowe informacje w rozdziale „Stopień realizacji podstawowych projektów rewitalizacyjnych”

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

| Cel 4 – Podniesienie społecznej i gospodarczej atrakcyjności przestrzeni publicznych | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|----------------|------------------------------------|--|--|--|----------------------------|------------------------|
| Nazwa wskaźnika | Miernik | Źródło Informacji | Śródmieście | | | | | | Miasto Ełk |
| | | | Wartość bazowa | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | Wartość docelowa (2023 r.) | 2019 r. |
| Poziom zrewitalizowania obszaru (powierzchnia, narastająco) | % | beneficjenci projektów wpisanych do Programu | 5,81% | 5,81% | 6,67% | 8,94% | 8,94% | 10,17% | nd |
| Otwarta przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na obszarach miejskich (narastająco) | m ² | beneficjenci projektów wpisanych do Programu | nd | 58,4 m ² | 2017 r. – 14 740,5 m ² Narastająco - 14 798,9 m ² | 2018 r. – 39 116,35 m ² Narastająco – 53 915,25 m ² | 2019 r. – 0 m ² Narastająco – 53 915,25 m ² | 75 000 | 2 587,12m ² |
| Długość wybudowanych/zmodernizowanych dróg (narastająco) | km | Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku | nd | 2016 r. – 0 Narastająco - 0,702 | 2017 r. – 0 Narastająco - 0,702 | 2018 r. – 0 Narastająco - 0,702 | 2019 r. – 0,725 Narastająco – 1,427 | 3 | 1,055 |

Komentarz – wskaźniki celu 4

W ubiegłym roku nie były realizowane inwestycje w przestrzeni publicznej w Śródmieściu Ełku, w związku z czym nie zwiększyły się wskaźniki zrewitalizowania obszaru. Przeprowadzono natomiast znaczącą inwestycję drogową dot. przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza (w ramach projektu „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – etap II”).

Poza modernizacją nawierzchni, przebudowane zostało skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z ulicami zamkową i Armii Krajowej na czterowlotowe skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną. Zakres prac obejmował również budowę nowego oświetlenia ulicznego zintegrowanego z miejskim systemem sterowania i monitoringu oświetlenia, modernizację sygnalizacji świetlnej, zamontowanie dodatkowych barierek na pasie dzielącym jezdnie, wybudowanie nowej ścieżki rowerowej z masy bitumicznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zamkowej.

W ramach prac przebudowane zostały również zjazdy, miejsca parkingowe oraz dwie istniejące zatoki autobusowe (wraz z ich przesunięciem i wymianą wiat). Pojawiła się nowa zatoka przystankowa na przeciwko kościoła NSJ na ul. Armii Krajowej oraz wykonano aktywne przejście dla pieszych w okolicy budynku Wojska Polskiego 68. Przy przebudowie ulicy wykonane były również prace ziemne m.in. budowa kanalizacji deszczowej, budowa odcinka sieci gazowej, wykonanie monitoringu wraz z kanalizacją teletechniczną. W okresie realizacji projektu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ełku sp. z o.o. przebudowało sieć wodno-kanalizacyjną.



ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Cel 5 – Wzrost potencjału turystycznego, sportowo-rekreacyjnego i kulturalnego w oparciu o zasoby przyrodnicze i dziedzictwa kulturowego


| Nazwa wskaźnika | Miernik | Źródło Informacji | Miasto Ełk | | | | | Wartość docelowa (2023 r.) |
|---|---------|--|----------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|
| | | | Wartość bazowa | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | |
| Udział całorocznych miejsc noclegowych w ogólnej liczbie dla województwa warmińsko-mazurskiego (w danym roku) | % | BDL GUS | 1,38% | 2,42% | 1,26% | 2,40% | 2,44% | 2,90% |
| Liczba noclegów przypadających na 1 turystę zagranicznego (w danym roku) | szt. | BDL GUS | 3,26 | 2,83 | 1,83 | 1,88 | 1,68 | 3,40 |
| Liczba produktów turystycznych | szt. | Urząd Miasta Ełku | 28 | 30 | 36 | 38 | 37 | 32 |
| | | | Śródmieście | | | | | |
| | | | Wartość bazowa | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | Wartość docelowa (2023 r.) |
| Zwiedzający muzea i oddziały na 1000 mieszkańców województwa (w danym roku) | osoby | BDL GUS | 22,48 | 25,27 | 30,89 | 35,59 | 56,12 | 40,00 |
| Wzrost liczby odwiedzin miejsc należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne, wspartych w programie (w porównaniu do 2015 r.) | szt. | Beneficjenci projektów wpisanych do Programu | nd | 3 9250 | 11 930 | 18 479 | 47 476 | 35 000 |
| Liczba budynków zabytkowych poddanych modernizacji (wpisanych do rejestru zabytków) - narastająco | szt. | Beneficjenci projektów wpisanych do Programu | nd | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |

Komentarz – wskaźniki celu 5

Cel 5 zakłada **zwiększenie atrakcyjności turystycznej Ełku**. Środowisko naturalne jest jednym z kluczowych zasobów determinujących atrakcyjność miasta. Zaplanowane działania mają stać się impulsem do przyciągnięcia turystów, aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Ełku oraz tworzenia nowych firm w branżach powiązanych z turystyką, kulturą, sportem i rekreacją. Będą również służyły mieszkańcom Ełku dla realizacji ich inicjatyw czy też spędzania czasu wolnego.

Dane GUS wskazują na **stabilizację wskaźników turystycznych**. W mieście jest 8 obiektów noclegowych oferujących 772 miejsca (7 obiektów całorocznych, 601 miejsc). W ubiegłym roku Ełk odwiedziło 21 127 turystów, czyli o 34 więcej niż w 2018 r. Wśród nich 3 206 pochodziło z zagranicy. Turyści skorzystali z 47 792 noclegów (-442 rok do roku). Średnia długość pobytu turysty w naszym mieście wynosiła 2,26 dni (1,68 w przypadku osób z zagranicy).

Wykres 4 Liczba turystów i udzielonych im noclegów w Ełku w latach 2015-2019 (źródło: BDL GUS).

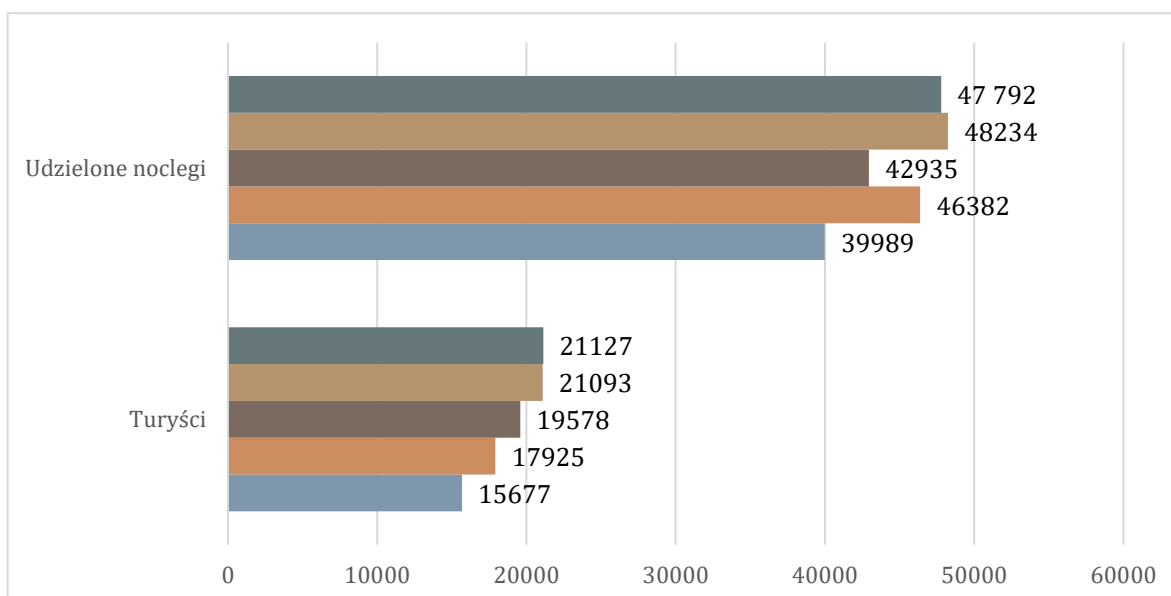

Kultura i dziedzictwo historyczne są ważnym elementem budowania wartości i tożsamości miasta oraz planowania społeczno-gospodarczego rozwoju. W programie rewitalizacji przewidziano działania zmierzające do podniesienia atrakcyjności turystycznej trzech największych **instytucji kultury** w Ełku: Muzeum Historycznego w Ełku (w oparciu o ofertę Ełckiej Kolei Wąskotorowej), Ełckiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej. W ubiegłym roku ECK rozpoczęło inwestycję polegającą na budowie nowej sali widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. Z kolei Miejska Biblioteka Publiczna czyni starania o pozyskanie zewnętrznego dofinansowania na przebudowę swojej siedziby.

W 2019 r. Muzeum Historyczne w Ełku mogło korzystać ze zmodernizowanej infrastruktury (budynek stacyjny, Park Odkrywców Kolei). Ponadto w ubiegłym roku MHE przeprowadziło remont wiaduktu kolejowego na odcinku Łaski Małe – Sypitki oraz przebudowało przystanek osobowy w Sypitkach wraz z wykonaniem placu zabaw. Liczba odwiedzających muzeum w 2019 r. wyniosła 79,8 tys. osób (wzrost o 29 tys. rok do roku). W tej liczbie oferta EKW przyciągnęła ponad połowę odwiedzających (przejazdy – 26,7 tys., oferta stacjonarna – 17,9 tys.).

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

W 2019 r. udzielono 4 dotacje z budżetu miasta na renowację ełckich zabytków dla następujących wnioskodawców³:

| I.p. | Nazwa Beneficjenta | Zakres prac | Kwota inwestycji | Udzielona kwota dotacji |
|-------------|--|---|-------------------------|--------------------------------|
| 1. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Orzeszkowej 5 w Ełku | renowacja elewacji, termomodernizacja ścian, wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej, docieplenie fundamentu. | 102 413,00 zł | 50 000,00 zł |
| 2. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Chopina 23 w Ełku | remont dachu (zdjęcie poszycia z desek, ułożenie folii, wymiana dachówki, obróbki blacharskie, wymiana rynien i rur spustowych) | 110 000,00 zł | 45 000,00 zł |
| 3. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Słowackiego 9 w Ełku | remont dachu (wymiana więźby dachowej oraz pokrycia), renowacja komina, izolacja termiczna. | 230 000,00 zł | 40 000,00 zł |
| 4. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Wawelskiej 6 w Ełku | renowacja dachu (wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, , deskowanie, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich). | 40 139,58 zł | 15 000,00 zł |

³ Od 2019 r. o dotacje mogą ubiegać się również obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

| Cel 6 - Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------------------|-------------|---------|---------|---------|----------------------------|------------|
| Nazwa wskaźnika | Miernik | Źródło Informacji | Wartość bazowa | Śródmieście | | | | | Miasto Ełk |
| | | | | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | Wartość docelowa (2023 r.) | 2019 r. |
| Średnie jednostkowe roczne zużycie energii w grupie budynków użyteczności publicznej (w danym roku) | kWh/m ² /rok | Urząd Miasta Ełku, Wydział Mienia Komunalnego | 153 | 141 | 140 | 138 | 135 | 145 | 135 |
| Liczba zmodernizowanych budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych (narastająco) | szt. | Administrator Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt”, Urząd Miasta Ełku – Wydział Mienia Komunalnego, Starostwo Powiatowe w Ełku | nd | 27 | 52 | 74 | 96 | 98 | nd |
| Nazwa wskaźnika | Miernik | Źródło Informacji | Wartość bazowa | Miasto Ełk | | | | | |
| | | | | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | Wartość docelowa (2023 r.) | |
| Roczne zużycie energii elektrycznej przez system oświetlenia miejskiego do liczby punktów świetlnych | MWh/punkt/rok | Urząd Miasta Ełku, Wydział Mienia Komunalnego | Wartość bazowa – 0,704 | 0,553 | 0,519 | 0,497 | 0,477 | 0,570 | |

Komentarz – wskaźniki celu 6

Wśród budynków w Ełku dominują wybudowane przed 1989 rokiem. Najwięcej takich obiektów znajduje się w „Śródmieściu”. W celu 6 zaplanowano więc realizację inwestycji poprawiających stan techniczny budynków, które przełożą się na efekt społeczny w postaci poprawy warunków życia mieszkańców „Śródmieścia”. Duże są zwłaszcza **potrzeby termomodernizacyjne**. Jest to jeden z warunków przeprowadzenia skutecznych działań aktywizacyjnych i integracyjnych społeczności obszaru rewitalizacji.

W ubiegłym roku, w Śródmieściu Ełku, różnego rodzaju pracom termomodernizacyjnym poddano 22 budynki zarządzane przez Administrator Sp. z o.o. i Spółdzielnię Mieszkaniową „Świt”. W ciągu ostatnich 3 lat w Śródmieściu Ełku termomodernizacją objęto już łącznie 96 budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej.

Tabela 4 Budynki wielorodzinne w Śródmieściu poddane pracom termomodernizacyjnym w latach 2016-2019 (źródło: SM „Świt”, Administrator Sp. z o.o.).


| Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" | Administrator Sp. z o.o. |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Armii Krajowej 9, 48 • Gdańska 12 • Gizewiusza 10A • Kościuszki 10, 12 • Mickiewicza 1, 7 • Wojska Polskiego 36, 40, 40A, 44, 44A, 67 • Żeromskiego 1 | <ul style="list-style-type: none"> • 3 Maja 5 • Armii Krajowej 6, 8, 15, 20, 27, 33, 38, 40 • Chopina 3, 11, 12, 19, 21, 23 • Czarna 1 • Gdańska 11, 22/24 • Gdańska 2/Mickiewicza 21 • Kościuszki 4, 20 • Magazynowa 1, 2 • Mickiewicza 1, 9, 14, 15, 22, 27, 28, 31, 34, 38, 37 i 39, 39A • Orzeszkowej 5, 6A, 10, 14A, 19, 22 • Słowackiego 4, 6, 8, 9 • Świackiego "Sępa" 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 • Toruńska 2 • Wawelska 1, 3, 4, 6, 8, 9, 13 • Wojska Polskiego 1 i 1A, 1B, 4, 5A, 6, 10, 18, 20, 24, 25, 33, 33A, 37, 42, 57, 63 |

Średnie jednostkowe roczne zużycie energii w grupie budynków użyteczności publicznej, zlokalizowanych w Śródmieściu, jak i całym mieście, zmalało kolejny rok z rzędu. Osiągnięcie zaplanowanej na 2023 r. wartości tego wskaźnika było możliwe dzięki ciepłym zimom i prowadzonym inwestycjami. Planowane przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji miejskich szkół i przedszkoli powinny przyczynić się do dalszego zmniejszania zapotrzebowania na energię, a tym samym do czystszej powietrza.

W celu monitorowania jakości powietrza w styczniu 2017 roku w Ełku przy ul. Piłsudskiego uruchomiono automatyczną stację pomiarową funkcjonującą w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). W 2019 r. stacja przy ul. Piłsudskiego odnotowała 13 dni z przekroczeniami poziomu pyłu zawieszonego PM10 (poziom powyżej 50 µg/m³), jednak w każdym z przypadków nie przekroczył on poziomu informowania, gdy konieczne jest ograniczenie aktywności na powietrzu (powyżej 200 µg/m³). W znacznej części przekroczenia były niewielkie. W 2018 r. zanotowano 18 dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego, a w 2017 r. takich dni było 24.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Wykres 5 Poziom pyłu zawieszonego PM10 w Ełku w 2019 r. (źródło: www.powietrze.gios.gov.pl).

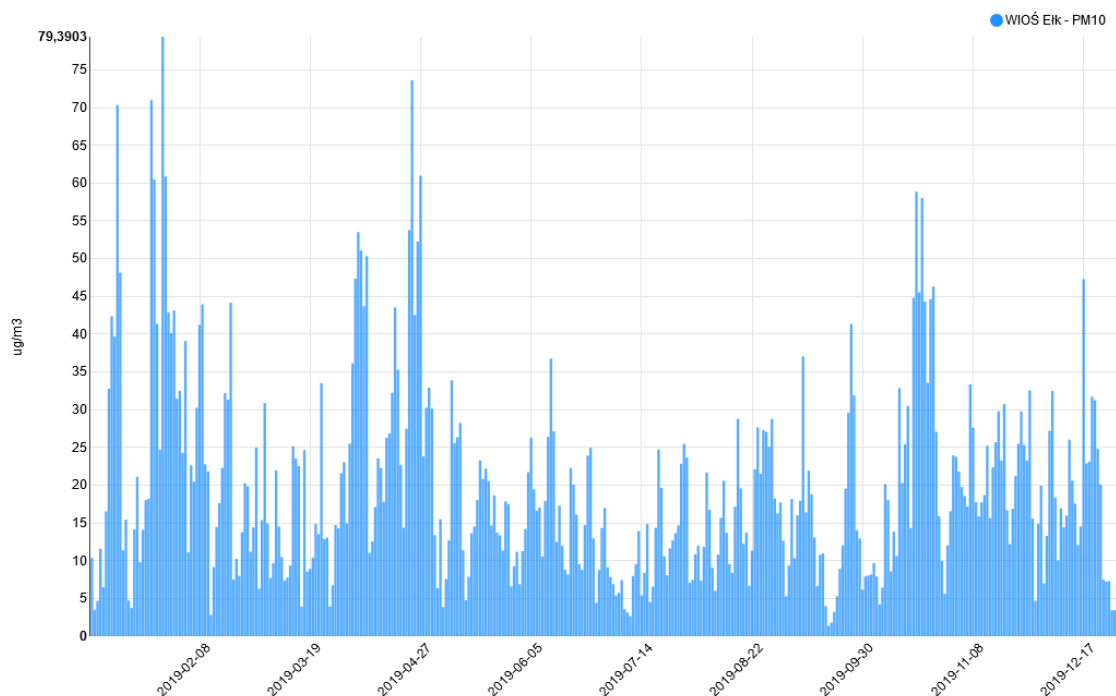


Informacje zdrowotne - Indeks Jakości Powietrza

| Indeks jakości powietrza | PM10 [µg/m³] | PM2,5 [µg/m³] | O ₃ [µg/m³] | NO ₂ [µg/m³] | SO ₂ [µg/m³] | C ₆ H ₆ [µg/m³] | CO [mg/m³] |
|--------------------------|---|---------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------|
| Bardzo dobry | 0 - 20 | 0 - 13 | 0 - 70 | 0 - 40 | 0 - 50 | 0 - 6 | 0 - 3 |
| Dobry | 20,1 - 50 | 13,1 - 35 | 70,1 - 120 | 40,1 - 100 | 50,1 - 100 | 6,1 - 11 | 3,1 - 7 |
| Umiarkowany | 50,1 - 80 | 35,1 - 55 | 120,1 - 150 | 100,1 - 150 | 100,1 - 200 | 11,1 - 16 | 7,1 - 11 |
| Dostateczny | 80,1 - 110 | 55,1 - 75 | 150,1 - 180 | 150,1 - 200 | 200,1 - 350 | 16,1 - 21 | 11,1 - 15 |
| Zły | 110,1 - 150 | 75,1 - 110 | 180,1 - 240 | 200,1 - 400 | 350,1 - 500 | 21,1 - 51 | 15,1 - 21 |
| Bardzo zły | > 150 | > 110 | > 240 | > 400 | > 500 | > 51 | > 21 |
| Brak indeksu | Indeks jakości powietrza nie jest wyznaczony z powodu braku pomiaru zanieczyszczenia dominującego w województwie. | | | | | | |


W 2019 r. Urząd Miasta Ełku zamontował dodatkowych siedem czujników do pomiaru stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10, które ze względu na swoją mikroskopijną wielkość oraz skład są uznawane za najbardziej niebezpieczne zanieczyszczenia atmosferyczne. Dzięki temu mieszkańcy mogą sprawdzić bieżący stan powietrza w pobliżu swojego domu, miejsca pracy czy budynków użyteczności publicznej.

Rysunek 4 Rozmieszczenie czujników do pomiaru stężenia pyłów PM2.5 i PM10, zamontowanych przez Urząd Miasta Ełku (źródło: <https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=145>).

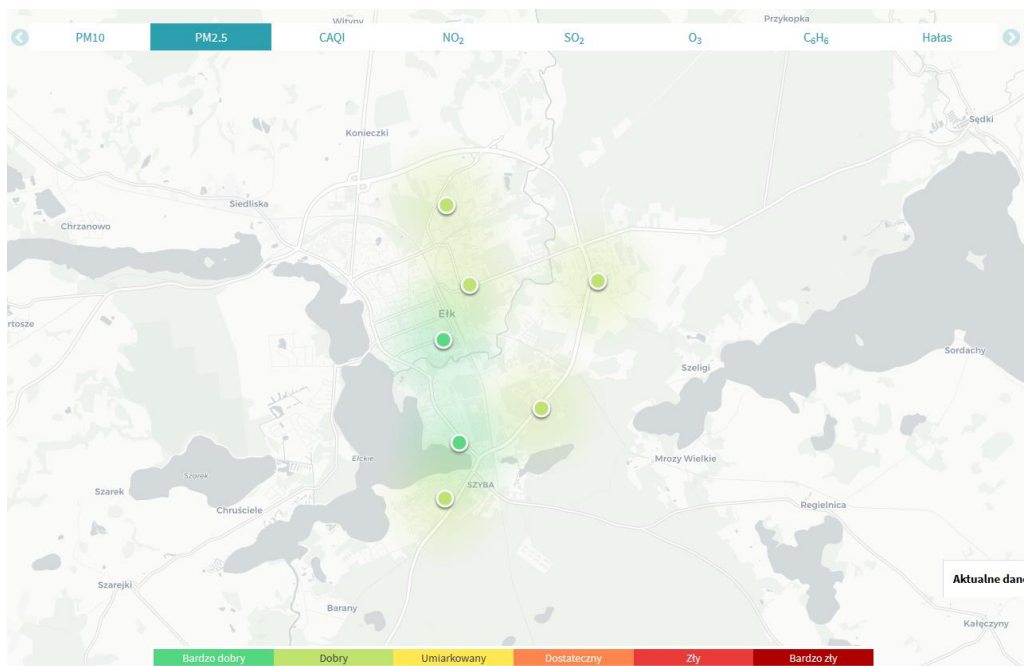

Zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej przez system oświetlenia miejskiego. Na przestrzeni ostatnich lat miasto Ełk prowadziło modernizację oświetlenia ulicznego. Energooszczędne punkty świetlne LED stanowiły w 2019 r. ok. 39% wszystkich punktów świetlnych w mieście. Dla porównania w 2015 r. wartość ta wynosiła zaledwie 3,28%. W wyniku modernizacji i konserwacji oświetlenia ulicznego odnotowano znaczną oszczędność w zużyciu energii elektrycznej, co przełożyło się na zmniejszenie opłat związanych z poborem prądu (zarówno w programie rewitalizacji, jak i w programie niskoemisyjnym⁴).

Tabela 5 Statystyki dot. oświetlenia ulicznego w Ełku w latach 2015-2019 (źródło: Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku).

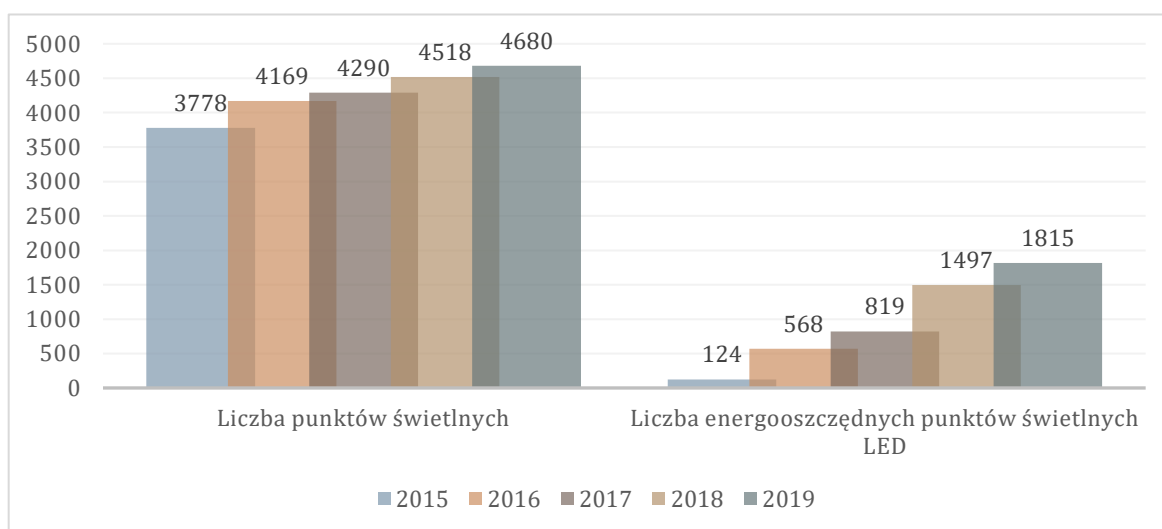

⁴„Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r.”

3. Sprawozdanie z działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA”

27 maja 2019 r. odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanego budynku Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA”. Odnowiony budynek ECRS znajduje się przy ul. Kościuszki 27 A.

W ECRS „STAJNIA” mieści się Poradnia Rodzinna, Punkt Konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem, Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz odbywają się cykliczne spotkania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo pomieszczenia udostępniane podmiotom i organizacjom podejmującymi działania na rzecz rodzin ze środowiska lokalnego, przede wszystkim z obszaru rewitalizacji.

Partnerzy ECRS „STAJNIA” to m.in. Stowarzyszenie „Alternatywa”, Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat, Stowarzyszenie Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Z pomieszczeń ECRS „STAJNIA”, korzystali również: Środowiskowy Dom Samopomocy Lawendowy Zakątek, Ełckie Stowarzyszenie Przyjaciół "Amazonki", Stowarzyszenie Rozwoju Produktu lokalnego „Wiatraki Mazur”, Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu, Ełckie Forum Rewitalizacji Społecznej Zespół Interdyscyplinarny Miasta Ełk, Klub Seniora „SENIOR+”.

Realizowane były kampanie społeczne m.in. Forum Kardiologiczne, Ełckie Obchody 15 lat w Unii Europejskiej, Majówka Międzypokoleniowa w ECRS „STAJNIA, Kampania Biała Wstążka. W budynku ECRS „Stajnia” organizowano spotkania integracyjne m.in. „Wigilia”, Seminarium „Zrozumieć niepełnosprawność”, zabawa integracyjna „Obchody 3-iej rocznicy ŚDS”, „Wielkanoc”, Gala Muzyki Disco Polo.

W 2019 r. w ECRS realizowano m.in. następujące projekty:

1. „Wsparcie Ełckich Rodzin” - ZIT – celem projektu jest kompleksowe wsparcie ełckich rodzin oraz rozwój usług społecznych poprzez udział 45 osób (29 kobiet, 16 mężczyzn) mieszkańców obszaru wyznaczonego do rewitalizacji w MOF Ełk w okresie 01.01.2019 r. – 30.11.2020 r. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku. Na terenie ECRS „STAJNIA” odbywają się m.in. zajęcia z Muzykoterapii i Dogoterapii, dzięki którym poprawia się funkcjonowanie zdrowia osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Projekt skierowany jest dla rodzin z dziećmi oraz do osób/rodzin z osobami niepełnosprawnymi i/lub starszymi.
2. „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia” – celem projektu jest zwiększenie aktywności 80 osób zamieszkałych na terenie obszarze wyznaczonym do rewitalizacji w ramach Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016- 2023 w wieku 18-65 lat poprzez aktywizację społeczną i zawodową w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Działania, które są realizowane na terenie ECRS „STAJNIA”, to usługi wspierające animację lokalną – zajęcia z animatorem, streetworkerem i pracownikiem socjalnym, warsztaty z doradcą zawodowym, warsztaty „zdrowy styl życia” itp.
3. „Lokalne perspektywy” – celem projektu jest rozwój usług społecznych oraz integracja rodzin ze środowiskiem lokalnym poprzez udział 132 osób (75 kobiet, 57 mężczyzn) mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełk w projekcie w okresie 01.09.2018 r. – 31.12.2020 r. Uczestnicy mogli skorzystać z warsztatów plastycznych, warsztatów wokalnych, warsztatów

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EŁCKIEGO CENTRUM REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ „STAJNIA”

gospodarowania budżetem domowym, treningu psychospołecznego oraz konsultacji indywidualnych. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Alternatywa” w Ełku.

4. „Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej” – celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 40 osób w wieku 15 – 40 lat, wykluczonych i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta Ełku oraz ich otoczenia (rodzice, rodzeństwo, opiekunowie). Zajęcia, które odbywają się w budynku ECRS „STAJNIA”, to m.in.: zajęcia sportowe, multimedialne, muzyczne, artystyczno-plastyczne, taneczne oraz wsparcie psychologa/terapeuty.
5. „Bezpieczna Przystań”- Miasto Ełk skutecznie przeciw przemocy”- projekt dofinansowany ze środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Celem projektu jest rozwój istniejącej infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie-utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Inne zajęcia na terenie ECRS „STAJNIA”, m.in.:

- Dni otwarte ECRS „STAJNIA”,
- Majówka Międzypokoleniowa,
- Ełckie Obchody 15 lat w Unii Europejskiej,
- Kampania Białej Wstążki STOP PRZEMOCY,
- Wigilia Stowarzyszenia Amazonek,
- Konferencja podsumowująca sezon turystyczny z Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu,
- Wigilia uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej Lawendowy Zakątek,
- Seminarium „Zrozumieć Niepełnosprawność”,
- „Obchody 3-tej rocznicy Środowiskowego Domu Samopomocy Lawendowy Zakątek”,
- Gala Muzyki Disco Polo Środowiskowego Domu Samopomocy Lawendowy Zakątek,
- Podsumowanie projektu „Aktywna młodzież w szkolnych klubach wolontariatu” – Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur”,
- Spotkanie w sprawie utworzenie zakładu aktywności zawodowej w Ełku,
- Forum Kardiologiczne „Tu bije moje serce”,
- Superwizja dla pracowników MOPS w Ełku,
- Grupa Wsparcia dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie,
- Spotkanie Ełckiego Forum Rewitalizacji Społecznej i zespołu ds. rewitalizacji Urzędu Miasta Ełku,
- Warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przestępczości ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzestępczości skierowane do osób dorosłych i do opiekunów dzieci,
- Spotkania z asystentami rodziny podnoszącymi kompetencje opiekuńczo wychowawcze rodziców,
- Spotkanie „Bezpieczny Senior”,
- Szkolenie pracowników z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku,
- Spotkanie organizacji pozarządowych organizowane przez Biuro Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Ełku.

Łącznie odbyło się 1512 zajęć grupowych i konsultacji indywidualnych, w tym projektów realizowanych na terenie ECRS „STAJNIA” w 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EŁCKIEGO CENTRUM REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ „STAJNIA”

Plany na 2020 r.

Działania ECRS STAJNIA będą wynikały ze współpracy ze społecznością lokalną, biorąc pod uwagę jej zróżnicowanie, oraz organizacjami i instrukcjami na szczeblu lokalnym. Poprzez swoją otwartość na środowisko, rozwój usług społecznych, działania animacyjne i wielostronną edukację, STAJNIA będzie miejscem aktywizującym i integrującym mieszkańców, inspirującym i zaspokajającym ich potrzeby. Miejscem działającym na rzecz wzrostu poczucia wspólnoty, tożsamości lokalnej. ECRS STAJNIA, aby jak najlepiej wywiązywać się z roli instytucji publicznej, będzie stale poszukiwać nowych sposobów odpowiadania na zmieniające się potrzeby mieszkańców i otoczenia. ECRS STAJNIA będzie wykazała potrzebę funkcjonowania przyczyniając się do rozwoju społeczności lokalnych oraz rozwoju całego miasta.

Cele działalności ECRS „STAJNIA” to na 2020 r.:

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, podczas działań realizowanych w ECRS STAJNIA oraz przedsięwzięć organizowanych w ramach inicjatyw lokalnych i innych działań.
2. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ełku dla rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.
3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez udostępnianie pomieszczeń ECRS na działania powiązane z Programem Profilaktyki.
4. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych.
5. Reintegracja społeczna i zawodowa osób i rodzin znajdujących się w kryzysie oraz w sytuacji ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
6. Rozwój oferty w kierunku samodzielności i samowystarczalności ECRS STAJNIA.
7. Kontynuująca realizacji projektów („Wsparcie Ełckich Rodzin” – ZIT”, „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia”, „Utworzenie i funkcjonowanie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej”, „Lokalne perspektywy”), działań Poradni Rodzinnej, Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.
8. Kontynuowanie współpracy z podmiotami, organizacjami pozarządowymi w realizacji przedsięwzięć i inicjatyw w społecznych.

Podsumowanie

„Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” funkcjonuje od 2016 r. Przez ten czas przeprowadzono najważniejsze prace inwestycyjne (ECRS STAJNIA, MOPS, PCPR, EKW, podwórka i inne przestrzenie publiczne) oraz rozpoczęto realizację głównych projektów z zakresu aktywizacji i integracji społecznej.

Rok 2019 r. był przede wszystkim okresem intensywnej realizacji projektów rewitalizacyjnych o charakterze społecznym. Różnorodnymi działaniami projektowymi objęto 212 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi, pracę metodą streetworkingu prowadziło 38 osób, zorganizowano 28 inicjatyw lokalnych. Należy jednak zaznaczyć, że skala projektów społecznych będzie prawdopodobnie mniejsza, niż to zakładano na etapie tworzenia programu rewitalizacji. Poprawiająca się sytuacja życiowa mieszkańców Ełku sprawia, że wsparciem może być objęta mniejsza liczba osób. W tym kontekście obecnie nie są znane konsekwencje społeczno-gospodarcze epidemii wirusa SARS-CoV-2, które być może zwiększą poziom bezrobocia i tym samym przyczynią się do zwiększenia skali innych problemów społecznych.

W obszarze rewitalizacji kontynuowane były działania poprawiające stan infrastruktury. W szczególności dotyczyło to efektywności energetycznej budynków i oświetlenia ulicznego, co z kolei przyczynia się do poprawy jakości powietrza. W ubiegłym roku przebudowano ulicę Wojska Polskiego, dzięki czemu jedna z głównych ulic obszaru rewitalizacji stała się bardziej bezpieczna, funkcjonalna i dostosowana do potrzeb transportu publicznego.

Analiza wskaźników służących monitorowaniu postępów w osiągnięciu celów programu rewitalizacji wskazuje, że Śródmieście pozostaje obszarem, w którym mamy do czynienia z występowaniem negatywnych zjawisk. Niepokojące jest pogorszenie sytuacji w takich sferach jak bezrobocie, przemoc w rodzinie, korzystanie z pomocy społecznej z powodu choroby. Śródmieście pozostaje obszarem odpływu mieszkańców (295 osób w ciągu roku). W związku z tym należy zastanowić się nad wprowadzeniem działań poprawiających efektywność procesu rewitalizacji. W pierwszej kolejności można wykorzystać narzędzia będące już w dyspozycji samorządu, takie jak inicjatywa lokalna, regranting czy dotacje dla organizacji pozarządowych (premiowanie działań na obszarze rewitalizacji i na rzecz mieszkańców tego obszaru). Poza tym należy lepiej wykorzystać istniejące ciała dialogu – Ełckie Forum Rewitalizacji i rady działające przy Prezydencie Miasta Ełku. Innym pomysłem może być stworzenie rady osiedlowej, wyposażonej w środki finansowe umożliwiające realizację przedsięwzięć zaplanowanych z udziałem mieszkańców Śródmieścia.
