



# SPRAWOZDANIE ZA 2020 ROK

Z REALIZACJI „PROGRAMU REWITALIZACJI EŁKU  
NA LATA 2016-2023”

*Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, 2021 r.*


## Spis treści

Wprowadzenie	3
1. Stopień realizacji podstawowych projektów rewitalizacyjnych	5
2. Analiza wskaźnikowa	25
3. Sprawozdanie z działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA”	43
Podsumowanie	46

## Wprowadzenie

W 2016 r. Rada Miasta Ełku przyjęła „Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”. Dokument został opracowany w oparciu o nowe podejście do procesu odnowy obszarów miejskich, zaprezentowane w rządowych „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”. Przygotowana została diagnoza całego miasta w oparciu o podziały urbanistyczne, bazujące na utrwalonych związkach przestrzennych, funkcjonalnych i społeczno-ekonomicznych. Diagnoza zawierała szczegółową analizę problemów społecznych oraz gospodarczych, technicznych, przestrzenno-funkcjonalnych i środowiskowych. Na jej podstawie zostały wyznaczone obszary zdegradowane, a spośród nich **obszar rewitalizacji o nazwie „Śródmieście”**, obejmujący (zgodnie z wytycznymi) nie więcej niż 20% powierzchni Ełku (172 ha – 8,17%) i zamieszkały przez nie więcej niż 30% mieszkańców (16 579 mieszkańców – 28,20%).

Rysunek 1 Obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji „Śródmieście”.

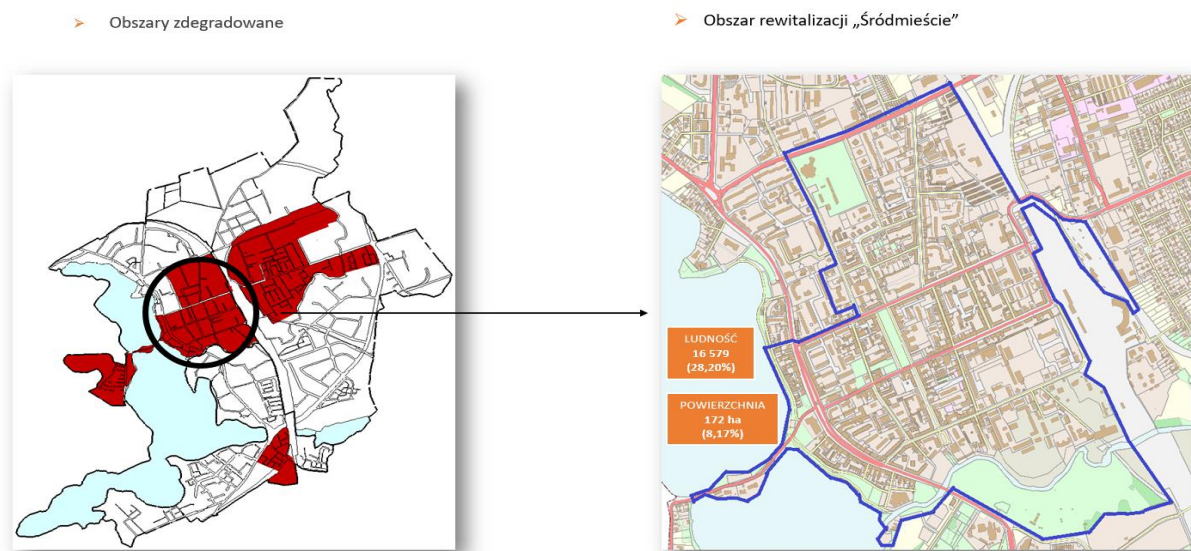

Następnie, przy udziale społeczności lokalnej, dokonano wyznaczenia kierunków i zaplanowania kompleksowych przedsięwzięć (integrujących działania społeczne, gospodarcze, przestrzenne, techniczne itp.), które w rezultacie mają wyprowadzić obszar rewitalizacji ze stanu kryzysowego i silniej włączyć go w rozwój całego miasta.

### Celem głównym

rewitalizacji Śródmieścia Ełku jest zaktywizowanie społeczne, gospodarcze i infrastrukturalne obszaru zagrożonego marginalizacją i silniejsze włączenie go w procesy rozwojowe.

Cel 1. Zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości.

Cel 2. Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych.

Cel 3. Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych.

Cel 4. Podniesienie społecznej i gospodarczej atrakcyjności przestrzeni publicznych.	Cel 5. Wzrost potencjału turystycznego, sportowo-rekreacyjnego i kulturalnego w oparciu o zasoby przyrodnicze i dziedzictwa kulturowego.	Cel 6. Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej
--	--	---

W osiągnięciu powyższych celów pomóc ma zaplanowany **system monitorowania realizacji programu, prowadzony na dwóch poziomach:**

1. przedstawienie informacji od beneficjentów projektów wpisanych do programu nt. realizacji danego projektu w roku sprawozdawczym, w tym sprawozdania Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej z wdrażania modelu rewitalizacji w Mieście Ełk;
2. analiza wskaźników sytuacji społeczno-gospodarczej dla całego miasta i obszaru rewitalizacji.

Monitoring realizacji „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” prowadzi Wydział Strategii Rozwoju Urzędu Miasta Ełku. Projekt sprawozdania za dany rok jest opiniowany przez Zespół ds. rewitalizacji Miasta Ełku oraz Ełckie Forum Rewitalizacji. Prezydent Miasta, w terminie do 30 czerwca każdego roku, przedstawia sprawozdanie Radzie Miasta Ełku. Sprawozdanie jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku.

# STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH


## 1. Stopień realizacji podstawowych projektów rewitalizacyjnych

Projekty ujęte w programie rewitalizacji zostały podzielone na 3 typy:

- ❖ **podstawowe projekty rewitalizacyjne**, realizowane w obszarze rewitalizacji i skierowane do mieszkańców tego obszaru, których realizacja w największym stopniu wpłynie na poprawę sytuacji w Śródmieściu Ełku;
- ❖ **uzupełniające rodzaje działań rewitalizacyjnych** tj. takie, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów Programu;
- ❖ **projekty komplementarne do projektów rewitalizacyjnych** – projekty skierowane do szerszego grona odbiorców, wykraczającego poza osoby z obszaru rewitalizacji, uzupełniające projekty rewitalizacyjne i dzięki którym prowadzone działania rewitalizacyjne nie będą skutkowały przenoszeniem problemów na inne obszary miasta lub nie będą prowadziły do niepożądanych efektów społecznych.

**W corocznych sprawozdaniach monitorowany jest postęp w realizacji projektów podstawowych.** Te działania są bowiem najistotniejsze z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów rewitalizacji. W programie rewitalizacji znalazło się **55 projektów** podstawowych zgłoszonych przez samorząd miejski, samorząd powiatowy, jednostki samorządowe z obszaru pomocy społecznej i kultury, organizacje pozarządowe, kościoły, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Na koniec 2020 r. ponad trzy czwarte projektów było w trakcie realizacji lub zakończyło się. Większość projektów, wskazanych jako nierealizowane, prawdopodobnie nie będzie wdrażanych ze względu na zbyt wysokie koszty lub rezygnację beneficjentów. Projekty nierealizowane nie mają jednak kluczowego znaczenia dla osiągnięcia celów programu. W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 działania w projektach społecznych realizowano w ograniczonym zakresie.

*Wykres 1 Stopień realizacji projektów podstawowych w 2020 r., ujętych w „Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” (szt., %).*

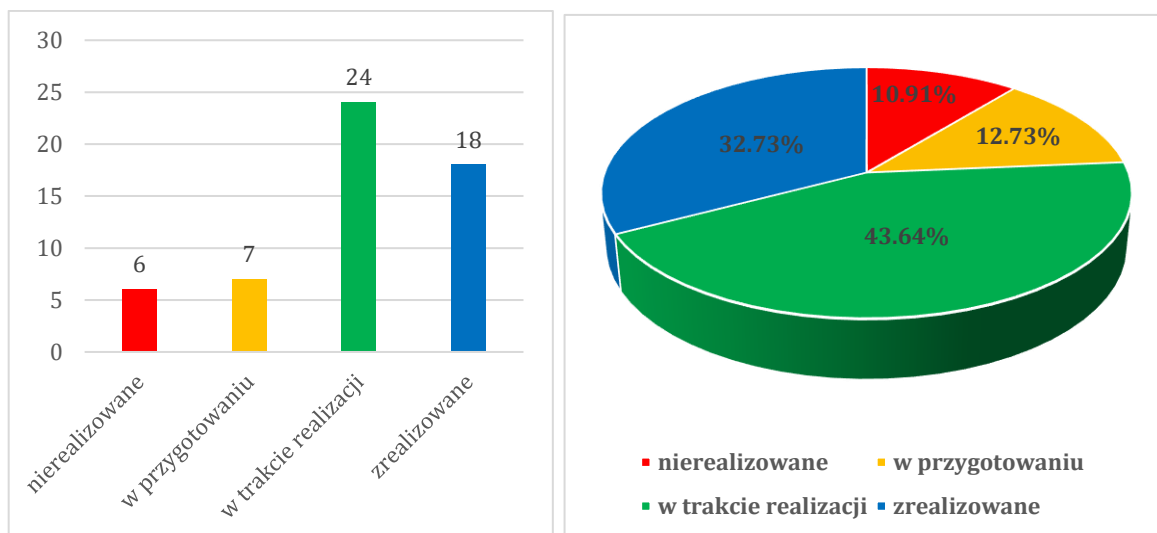

# STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stan realizacji
1.	Rewitalizacja zespołu zamkowego w Ełku i obszaru wyspy zamkowej	PW Doryb Piotr Basiewicz, Piotr Basiewicz (właściciel) lub Fundacja Zamek w Ełku	<p><b>Projekt w przygotowaniu</b></p> <p>Beneficjent ma przeprowadzone badania archeologiczne i architektoniczne, powstały opracowania naukowe. Przygotowana jest również koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania wyspy zamkowej. W ubiegłym roku nie były prowadzone prace zmierzające do realizacji inwestycji.</p>
2.	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	Gmina Miasto Ełk	<p><b>Projekt zrealizowany</b></p> <p>W 2019 roku zakończyła się realizacja projektu „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – etap II”, w wyniku której przebudowana została ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza. Zakres prac objął m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie nawierzchni: jezdni, zatok autobusowych, chodników, ścieżki rowerowej;</li> <li>• „wyprostowanie” skrzyżowania ul. Amii Krajowej, ul. Zamkowej, ul. Wojska Polskiego (w celu dojechania z ul. Armii Krajowej do ul. Zamkowej nie będzie trzeba wykonywać nawrotek);</li> <li>• budowę oświetlenia ulicznego zintegrowanego z miejskim system sterowania i monitoringu oświetlenia;</li> <li>• modernizację sygnalizacji świetlnej;</li> <li>• montaż dodatkowych barierek ogrodzeniowych na pasie dzielącym;</li> <li>• wykonanie nowej ścieżki rowerowej z masy bitumicznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zamkowej;</li> <li>• budowę kanalizacji deszczowej;</li> <li>• wykonanie monitoringu wraz z kanalizacją teletechniczną;</li> <li>• budowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacji sanitarnej (koszt PWiK);</li> <li>• budowę odcinka sieci gazowej;</li> <li>• modernizację miejsc parkingowych i wyznaczenie miejsc dla niepełnosprawnych;</li> <li>• cofnięcie zatoki przystankowej na ul. Wojska Polskiego w okolice „Rolnika”, nowa zatoka przystankowa na ul. Armii Krajowej (naprzeciwko kościoła NSJ).</li> </ul>



# STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stan realizacji
			<p>Całkowita wartość projektu to 10,61 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO WiM wyniosło 4,56 mln zł. Wkład własny z budżetu miasta Ełku wyniósł 6,05 mln zł.</p> <p>W okresie realizacji ww. projektu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ełku sp. z o.o. przebudowało sieć wodno-kanalizacyjną. Na ten cel wydatkowano 1,82 mln zł.</p>
3.	Zagospodarowanie pustych przestrzeni dla rozwoju funkcji turystyczno – rekreacyjnych w mieście Ełk	Gmina Miasto Ełk	<p><b>Projekt zrealizowany</b></p> <p>Gmina Miasto Ełk zrealizowała w 2018 r. projekt pn. „Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku”. W ramach projektu, w obszarze rewitalizacji, przebudowane zostały następujące odcinki ścieżek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nad rzeką Ełk, w sąsiedztwie Placu Jana Pawła II;</li> <li>• w kierunku ul. Żeromskiego i Placu Katedralnego;</li> <li>• przy ul. Parkowej – V etap Parku Kopernika.</li> </ul> <p>Została również usunięta stara i zamontowana nowa kładka na rzece Ełk, łącząca Plac Jana Pawła II z ul. Żeromskiego i Placem Katedralnym. Pojawiła się infrastruktura towarzysząca, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania inwestycji, w postaci m.in. miejsc do obsługi rowerów, murków parkowych z okładzinami granitowymi, drewnianych ławek do siedzenia, zagospodarowania zielenią, pozostałych elementów małej architektury oraz oświetlenia LED (częściowo wyposażonego w detektor ruchu).</p> <p>Całkowita wartość inwestycji to ok. 8,38 mln zł, a pozyskane wsparcie środkami UE wynosi ok. 4,44 mln zł.</p>
4.	Przebudowa i modernizacja dróg w obszarze śródmieścia Ełku	Gmina Miasto Ełk	<p><b>Projekt w trakcie realizacji</b></p> <p>Projekt zakłada przebudowę dróg i skrzyżowań w obszarze rewitalizacji, z wyłączeniem ul. Wojska Polskiego (ujęta w projekcie nr 2). W 2020 r. nie przeprowadzono inwestycji na ulicach objętych projektem - Małeckich, Orzeszkowej, 3 Maja, Piłsudskiego, Mickiewicza, Roosevelta, Dąbrowskiego.</p>
5.	Rewitalizacja ełckich podwórek	Gmina Miasto Ełk	<p><b>Projekt w trakcie realizacji</b></p> <p>Projekt zakłada modernizację 17 podwórek w „Śródmieściu Ełku”. W 2017 r. przeprowadzono prace inwestycyjne na 7 podwórkach. Natomiast w 2018 r. zmodernizowano następujące kolejne 9 podwórek.</p>

## STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stan realizacji
			<p>Remonty podwórek były w znacznej mierze finansowane ze środków UE. Z programu regionalnego Gmina Miasto Ełk pozyskała 3,9 mln zł (całkowita wartość projektu 6,56 mln zł), a z programu transgranicznego Litwa-Polska 1,3 mln zł (całkowita wartość projektu po stronie Ełku, wraz z działaniami społecznymi, to 2,2 mln zł).</p> <p>Łącznie zmodernizowanych zostało 16 z 17 podwórek założonych w projekcie. Do modernizacji pozostało podwórko przy ul. Wojska Polskiego 35-39.</p> <p>W 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie środkami UE dot. modernizacji 2 podwórek spoza listy: ul. Chopina 14-16 i Wawelska 22 (wartość planowanej inwestycji: 1,33 mln zł).</p>
6.	Adaptacja budynku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej	Gmina Miasto Ełk	<p><b>Projekt zrealizowany</b></p> <p>W 2018 r. zakończyła się modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 27A, na który Gmina Miasto Ełk otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych (RPO WiM 2014-200, ZIT bis Ełk). Wymieniono pokrycie dachu, naprawiono elewację budynku, przeprowadzono termomodernizację, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, przebudowano pomieszczenia, wykonano instalacje wewnętrzne oraz przyłącza budynków do wszystkich mediów. W ramach inwestycji zagospodarowany został również teren wokół budynku i zbudowana droga dojazdowa do obiektu wraz z miejscami postojowymi. W budynku funkcjonuje Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia” (w nawiązaniu do dawnej funkcji z czasów funkcjonowania koszar wojskowych). Instytucja będzie fundamentem społecznego wymiaru rewitalizacji, zapewniając infrastrukturę i kapitał społeczny do przeprowadzenia tego procesu. Zostaną utworzone m.in. pracownie tematyczne w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych oraz współpracy międzypokoleniowej. Będą tam również prowadzone działania aktywizujące społecznie dzieci, młodzież i dorosłych. Z budynku będą korzystać ełccy animatorzy i pedagodzy ulicy, którzy będą realizowali zajęcia wspierające osoby borykające się z różnymi problemami.</p> <p>Całkowita wartość projektu to 4,79 mln zł, a dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu państwa wyniosło 3,94 mln zł.</p>



# STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stan realizacji
7.	Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej (schemat A)	Stowarzyszenie Alternatywa (w partnerstwie z Gminą Miastem Ełk/MOPS)	<p><b>Projekt w trakcie realizacji</b></p> <p>Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Alternatywa (partner wiodący).</p> <p>Uczestnikami projektu są osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 15-30 lat. Wsparciem objęte są osoby z tzw. grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne, zmagające się z wielowymiarowymi problemami i w związku z tym wymagające szerokiego spektrum działań, a także otoczenie tych osób. Projekt przyczyni się do podniesienia aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Śródmieścia Ełku.</p> <p>W 2020 r. były realizowane następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aktywizacja społeczno, zawodowa, edukacyjna m.in. treningi, zajęcia, warsztaty, animacja, streetworking;</li> <li>• organizacja szkoleń, kursów i staży zawodowych.</li> </ul> <p>Okres realizacji projektu: od 01.08.2018 r. do 31.07.2021 r.</p> <p>W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 364 392,75 zł (dofinansowanie UE – 347 892,75 zł).</p>
8.	Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia (schemat A)	Gmina Miasto Ełk	<p><b>Projekt w trakcie realizacji</b></p> <p>Celem projektu jest zwiększenie aktywności osób zamieszkałych na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, w wieku 18 - 65 lat, poprzez aktywizację społeczną i zawodową. W 2020 r. realizowane były następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poradnictwo specjalistyczne, konsultacje indywidualne, doradztwo zawodowe;</li> <li>• organizacja warsztatów i zajęć;</li> <li>• zajęcia praktyczne w utworzonych i doposażonych pracowniach przedsiębiorczości, rzemiosła i aktywności;</li> <li>• organizacja kursów kwalifikacyjnych;</li> <li>• organizacja staży zawodowych;</li> <li>• realizacja projektów socjalnych i kontraktów socjalnych</li> </ul> <p>Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 31.05.2021 r. W ubiegłym roku poniesiono wydatki w wysokości 556 519,60 zł (dofinansowanie UE – 520 519,60 zł).</p>

# STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stan realizacji
9.	Lokalne perspektywy (schemat A)	Stowarzyszenie Alternatywa (w partnerstwie z Gminą Miastem Ełk/MOPS)	<p><b>Projekt w trakcie realizacji</b></p> <p>Projekt jest wynikiem doświadczeń Gminy Miasta Ełk w obszarze animacji lokalnej oraz streetworkingu. Realizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenie Alternatywa i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Uczestnikami projektu są mieszkańcy obszaru rewitalizacji, zagrożeni ubóstwem i /lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne (tzw. oddalone od rynku pracy, III profil), oraz otoczenie tych osób. Wsparciem objęte są osoby, które od wielu pokoleń dziedziczą skutki wszelkiego rodzaju niedostatków (tzw. dziedziczona bezradność). Zespoły składające się z animatora i streetworkera pracują na podwórkach w obszarze rewitalizacji, w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia”, MOPS, na terenie Parku Kopernika i Parku Odkrywców Kolei.</p> <p>W 2020 r. realizowano następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• organizacja zajęć i treningów,</li> <li>• praca w środowisku otwartym na terenach rewitalizowanych podwórek,</li> <li>• organizowanie spotkań,</li> <li>• poradnictwo specjalistyczne,</li> <li>• warsztaty i treningi dla rodzin.</li> </ul> <p>Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 31.03.2021 r.</p> <p>W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 447 726 zł (dofinansowanie UE – 415 326 zł).</p>
10.	Modernizacja infrastruktury i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku przy ul. Piłsudskiego 8	Gmina Miasto Ełk	<p><b>Projekt zrealizowany</b></p> <p>Prace remontowe i modernizacyjne prowadzone były w latach 2017 – 2018. W tym czasie budynek przeszedł gruntowne zmiany wewnątrz i na zewnątrz. Wyremontowano i wyposażono pomieszczenia znajdujące się na parterze oraz pierwszym piętrze, a także piwnicę, klatkę schodową i wiatrołap. Rozbudowane zostały skrzydła zachodnie i wschodnie (taras) o dodatkowe pomieszczenia. Nadbudowano również taras na wysokość drugiego piętra. Przeprowadzono termomodernizację budynku wraz z remontem pokrycia dachowego. Wyremontowano korytarz, pomieszczenia biurowe i piwnicę. Ostatnim etapem było zagospodarowanie terenu, m.in. wykonanie dojazdów i dojazdów, a także zieleni.</p>

# STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stan realizacji
			<p>Łączny koszt prac to ponad 1,9 mln zł, z czego 970 tys. zł stanowiło dofinansowanie II i III etapu ze środków UE w ramach projektu „Rozwój Transgranicznych Inicjatyw Społecznych” z Programu Współpracy V-A Litwa – Polska 2017 – 2018. W projekcie unijnym realizowane były również tzw. działania miękkie, m.in. szkolenia, wizyty studyjne, warsztaty, spotkania z logopedą i prawnikiem, a także zajęcia z integracji sensorycznej i trening umiejętności społecznej.</p> <p>Łączna wartość przedsięwzięć nieinwestycyjnych to kwota ponad 618 tys. zł.</p>
11.	Aktywna integracja (schemat A)	Gmina Miasto Ełk, MOPS we współpracy z organizacją pozarządową	<p><b>Projekt nierealizowany</b></p> <p>Działania założone w tym projekcie były realizowane w projektach z zakresu usług społecznych i projektach aktywizacyjnych m.in. „Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt ZIT”, „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia”.</p>
12.	Wsparcie ełckich rodzin (schemat A)	Gmina Miasto Ełk	<p><b>Projekt zrealizowany</b></p> <p>Celem projektu jest kompleksowe wsparcie ełckich rodzin oraz rozwój usług społecznych przyczyniających się do zmniejszenia przypadków umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Wsparciem w ramach projektu objęto 57 osób (38 kobiet i 19 mężczyzn), w tym 22 osoby niepełnosprawne.</p> <p>W 2020 r. realizowano następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poradnictwo specjalistyczne,</li> <li>• wsparcie asystenta rodziny i pracownika socjalnego,</li> <li>• warsztaty i treningi,</li> <li>• zajęcia z animatorem,</li> <li>• zajęcia z hipoterapii, dogoterapii, muzykoterapii,</li> <li>• wyjazdy rodzinne, zajęcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,</li> <li>• realizacja projektów socjalnych i kontraktów socjalnych.</li> </ul> <p>Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 30.11.2020 r.</p> <p>W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 202 125 zł (fundusze UE – 191 125 zł).</p>

# STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stan realizacji
13.	Świadomi mieszkańcy (schemat A)	Gmina Miasto Ełk we współpracy z MOPS Ełk i organizacją pozarządową	<p><b>Projekt nierealizowany</b></p> <p>Działania założone w tym projekcie były realizowane w projektach z zakresu usług społecznych i projektach aktywizacyjnych m.in. „Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt ZIT”, „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia”.</p>
14.	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku	Powiat Ełcki	<p><b>Projekt zrealizowany</b></p> <p>Na przeprowadzenie tej inwestycji Powiat Ełcki pozyskał dofinansowanie z instrumentu ZIT bis Ełk (Działanie 8.3 RPO WiM 2014-2020). Wartość prac modernizacyjnych i adaptacyjnych to 0,87 mln zł, a wsparcie UE wyniosło 0,66 mln zł. Projekt zakończył się w 2018 r.</p> <p>Podczas realizacji projektu wykonano prace architektoniczno - konstrukcyjne, elektryczne, sanitarne oraz montaż windy. Zaadaptowano zdegradowane poddasze na cele społeczne. Otwartą dotychczas przestrzeń podzielono na kilka pomieszczeń, wybudowano łazienkę dla osób z niepełnosprawnościami, doświetlono poddasze poprzez montaż okien dachowych. Jedną z nieużytkowanych klatek schodowych przebudowano na szyb windy, jednocześnie zachowując zabytkowy charakter budynku. Dodatkowo zakupiono wyposażenie niezbędne do zapewnienia pełnej funkcjonalności adaptowanej do celów społecznych przestrzeni budynku, takie jak meble i sprzęt elektroniczny.</p> <p>Inwestycja znacznie wpłynie na podniesienie liczby oraz dostępności świadczonych usług społecznych. Nowo powstałe sale terapeutyczne umożliwią zarówno wysoką jakość prowadzenia pracy grupowej, jak i indywidualnej. Prowadzone w komfortowych warunkach poradnictwo z psychologiem, doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym stanowić będzie cenny element w procesie aktywizacji społecznej oraz zawodowej podopiecznych PCPR. Podniesienie jakości wyżej wymienionych usług społecznych przyczyni się do rozwoju kompetencji wychowawczych, społecznych, interpersonalnych i zawodowych podopiecznych PCPR oraz umożliwi integrację ze środowiskiem lokalnym.</p>

# STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stan realizacji
15.	Razem przeciw wykluczeniu społecznemu (schemat A)	Powiat Ełcki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	<p><b>Projekt zrealizowany</b></p> <p>Powiat Ełcki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2019 r. zrealizował projekt pt. „Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków RPO WiM lata 2014-2020. Wsparciem objęto 25 osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego - zamieszkujących obszar „Śródmieście”.</p> <p>Głównym celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu wychowanków pieczy zastępczej oraz członków ich rodzin poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych. Wsparcie ukierunkowane było przede wszystkim na kształtowanie postaw prospołecznych i odpowiedzialnego rodzicielstwa poprzez rozwój kompetencji życiowych, społecznych oraz zawodowych, umiejętności do pełnienia ról społecznych, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, wsparcie samodzielności. Beneficjenci objęci zostali specjalistycznym wsparciem psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego. Uczestniczyli w warsztatach, treningach, Szkole Dla Rodziny, grupie wsparcia, wyjazdach integracyjno-aktywizacyjnych.</p> <p>Łączna wartość projektu: 121 170,00 zł, dofinansowanie projektu z UE: 101 843,25 zł.</p>
16.	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku	Gmina Miasto Ełk/Muzeum Historyczne w Ełku	<p><b>Projekt w trakcie realizacji</b></p> <p>W 2018 roku zakończyły się prace związane z remontem zabytkowego budynku stacyjnego, w którym obecnie swoją siedzibę ma Muzeum Historyczne w Ełku. Zrealizowany został również II etap przedsięwzięcia - utworzenie na terenie EKW Parku Odkrywców Kolei. Na terenie parku zostały zainstalowane urządzenia, które pozwolą w prosty sposób pokazać zasady fizyki, które wykorzystywane są w pracy kolei wąskotorowej.</p> <p>W 2020 r. złożony został wniosek o dofinansowanie UE inwestycji polegającej na modernizacji i wyposażeniu zabytkowego budynku lokomotywowni na potrzeby działalności muzeum. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 0,98 mln zł, przy łącznym koszcie w wysokości 1,19 mln zł. Termin realizacji inwestycji – do końca 2022 r.</p> <p>III etap przedsięwzięcia zakłada budowę nowej siedziby muzeum wraz z placem muzealnym. Uzależnione jest to od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych i nie jest już możliwe do zrealizowania w okresie obowiązywania obecnego programu, tj. do końca 2023 r.</p>

# STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stan realizacji
17.	Dziedzictwo Mazur	Gmina Miasto Ełk/Muzeum Historyczne w Ełku	<p><b>Projekt w trakcie realizacji</b></p> <p>W ramach przedsięwzięcia w 2020 r. zostały przeprowadzony remont torowiska Ełckiej Kolei Wąskotorowej (wymiana podkładów i mostownic, profilowanie toru). Na realizację powyższych działań wydano 302 617,71 zł. Projekt ma charakter ciągły.</p>
18.	Prace renowacyjne w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku	Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku	<p><b>Projekt w trakcie realizacji</b></p> <p>Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku uzyskała dofinansowanie UE na realizację projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Ełku poprzez prace konserwacyjne w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego”. Działania zaplanowane w ramach projektu polegają na przeprowadzeniu prac remontowo-budowlanych dachu, prac konserwatorskich i renowacyjnych organów oraz zakupie wyposażenia. Projekt służy poprawie istniejącego stanu lokalowego i poszerzeniu oferty kulturalno-oświatowej.</p> <p>Całkowita wartość projektu wynosi 1 927 329,00 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 1 082 910,00 (dofinansowanie UE – 925 041,00 zł). Planowany termin zakończenia prac to 2021 r.</p>
19.	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego	Gmina Miasto Ełk	<p><b>Projekt zrealizowany</b></p> <p>Projekt zakładał kontynuację zagospodarowywania terenu przy rzece Ełk u zbiegu ulic Parkowej i Wojska Polskiego – kolejnych etapów Parku Kopernika. Realizacja inwestycji nastąpiła w 2018 r. Zbudowano ciąg pieszo-rowerowy łączący ul. Wojska Polskiego z promenadą oraz stalową kładkę pieszą przez rzekę Ełk wraz z montażem iluminacji. Przeprowadzona została regulacja brzegów rzeki - oczyszczenie i odmulenie dna oraz wykonanie umocnień. Pojawił się taras wypoczynkowy, ławki parkowe, stoły piknikowe, nowe oświetlenie terenu i nasadzenia. Cały obszar został zagospodarowany zielenią.</p> <p>Koszt projektu wyniósł ok. 5,47 mln zł, a 3,39 mln zł pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.</p> <p>Z kolei etap V był częścią projektu pn. „Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku”, opisanego szerzej w pkt. 3.</p>



# STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stan realizacji
20.	Centrum Aktywności Seniorów	Gmina Miasto Ełk we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku	<p><b>Projekt w trakcie realizacji</b></p> <p>Od 2018 r. w Ełku funkcjonuje Klub Seniora „Senior+”. Mieści się on na parterze budynku przy ul. Piłsudskiego 10. Placówka powstała dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.</p> <p>W ubiegłym roku w Klubie Seniora nie był realizowany projekt rewitalizacyjny, czyli skierowany w całości do osób starszych z obszaru rewitalizacji. Prowadzone działania (np. „Domowy Klub Seniora” w formie zdalnej w ramach Klubu Seniora Senior +) miały charakter ogólnomiejski.</p>
21.	Rewaloryzacja budynku Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku	Powiat Ełcki/ Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku	<p><b>Projekt w trakcie realizacji</b></p> <p>W 2018 roku przeprowadzono remont elewacji budynku od strony południowej. Na ten cel przeznaczono 115 tys. zł.</p> <p>W 2020 r. nie realizowano działań w ramach projektu.</p>
22.	Zagospodarowanie terenu i zieleni Ełckiego Centrum Kultury	Ełckie Centrum Kultury	<p><b>Projekt zrealizowany</b></p> <p>Zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury jest częścią realizowanego projektu „Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury” (dofinansowanego z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020). Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2018 r. Prace zakończono w sierpniu 2020 r.</p> <p>W wyniku realizacji projektu powstała wielofunkcyjna sala kameralna (teatralna, koncertowa, filmowa, warsztatowa, konferencyjna) z wyposażeniem, która w zależności od funkcji pomieści od 80 do 150 osób. Teren między budynkiem Ełckiego Centrum Kultury a ulicą Zamkową został zagospodarowany pod park muzyczny, w którym znalazła się scena, zabawki i instrumenty plenerowe.</p> <p>Wartość projektu to 8,04 mln zł, a dofinansowanie unijne wynosi 5,99 mln zł.</p> <p>Poniesione koszty w 2020 r. to 3 979 023,18 zł (dofinansowanie UE – 2 856 203,19 zł).</p>
23.	Zadaszenie amfiteatru Ełckiego Centrum Kultury	Ełckie Centrum Kultury	<p><b>Projekt nierealizowany</b></p>

## STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stan realizacji
24.	Wielopokoleniowa integracja społeczna	Rzymskokatolicka Parafia NSJ w Ełku/Akcja Katolicka im. Św. Stanisława Kazimierczyka	<b>Projekt w trakcie realizacji</b> W 2020 r. nie były prowadzone działania w ramach projektu.
25.	Przeciwdziałanie marginalizacji osób bezdomnych	Dom dla osób bezdomnych i najuboższych Monar-Markot w Ełku	<b>Projekt nierealizowany</b>
26.	Termomodernizacja budynku przy ul. Chopina 23	Administrator sp. z o.o. w Ełku	<b>Projekt w trakcie realizacji</b> W 2019 r. w budynku dokonano remontu dachu. W 2020 r. wykonano inwestycję centralnego ogrzewania (przyłącze ciepłe, węzeł ciepły, instalacja c.o.). Koszt prac wyniósł 86 926 zł.
27.	Termomodernizacja budynku przy ul. Gdańskiej 22/24	Administrator sp. z o.o. w Ełku	<b>Projekt zrealizowany</b> Projekt zrealizowany w 2016 r. Inwestycja polegała na remoncie elewacji z dociepleniem. Zakres prac obejmował wykonanie docieplenia styropianem z kolorystyczną wyprawą elewacyjną, zwieńczenie docieplenia obróbkami blacharskimi, remont balkonów, wymianę okienek piwnicznych. Koszt prac wyniósł 189 tys. zł.
28.	Termomodernizacja budynku przy ul. Orzeszkowej 14A	Administrator sp. z o.o. w Ełku	<b>Projekt zrealizowany</b> Projekt zrealizowany w 2016 r. Wykonano remont elewacji z dociepleniem (docieplenie ścian styropianem, wykonanie kolorystycznej wyprawy elewacyjnej, wymiana podokienników, remont balkonów). Na realizację inwestycji przeznaczono 225 tys. zł.

# STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stan realizacji
29.	Termomodernizacja budynku przy ul. Gdańskiej 2/Mickiewicza 21	Administrator sp. z o.o. w Ełku	<p><b>Projekt zrealizowany</b></p> <p>Projekt zrealizowany w 2016 r. W ramach inwestycji docieplono strop ostatniej kondygnacji, wymieniono część pokrycia dachu, wykonano docieplenie ścian styropianem wraz z kolorystyczną wyprawą elewacyjną, dokonano zwieńczenia docieplenia obróbkami blacharskimi. Całkowita wartość przeprowadzonych prac wyniosła 340 tys. zł.</p>
30.	Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 37 i 39	Administrator sp. z o.o. w Ełku	<p><b>Projekt w trakcie realizacji</b></p> <p>W 2016 r. w ramach projektu dokonano remontu elewacji frontowej z dociepleniem. Zakres prac obejmował docieplenie ściany frontowej styropianem z wykonaniem kolorystycznej wyprawy elewacyjnej, docieplenie bram wjazdowych, wymianę podokienników oraz remont balkonów.</p> <p>W 2020 r. nie prowadzono prac termomodernizacyjnych budynku.</p>
31.	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 24	Administrator sp. z o.o. w Ełku	<p><b>Projekt w trakcie realizacji</b></p> <p>W poprzednim roku przeprowadzono część działań przewidzianych w projekcie. Wykonano remont elewacji od strony klatek schodowych z dociepleniem i wykonaniem kolorystycznej wyprawy elewacyjnej.</p> <p>W 2020 r. nie prowadzono prac termomodernizacyjnych budynku.</p>
32.	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 33A	Administrator sp. z o.o. w Ełku	<p><b>Projekt w trakcie realizacji</b></p> <p>Wspólnota Mieszkaniowa w 2018 r. zrealizowała remont pokrycia dachowego oraz docieplenia budynku w poziomie ostatniej kondygnacji.</p> <p>W 2020 r. nie prowadzono prac termomodernizacyjnych budynku.</p>
33.	Termomodernizacja budynku przy ul. Gdańskiej 20	Gmina Miasto Ełk	<p><b>Projekt zrealizowany</b></p> <p>Gmina Miasto Ełk otrzymała dofinansowanie ze środków RPO WiM 2014-2020 na termomodernizację budynku. Inwestycja została wykonana w 2020 r. Wykaz wykonanych prac:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wzmocnienie ścian konstrukcyjnych,</li> <li>• ocieplenie ścian,</li> </ul>

# STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stan realizacji
			<ul style="list-style-type: none"> <li>ocieplenie dachu styropapą,</li> <li>ocieplenie stropu nad piwnicą wełną,</li> <li>wykonanie pomieszczenia węzła,</li> <li>wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami,</li> <li>montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach zewnętrznych,</li> <li>wymiana drzwi zewnętrznych,</li> <li>remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich,</li> <li>remont kominów na dachu,</li> <li>renowacja elewacji poprzez czyszczenie i hydrofobizacja,</li> <li>wykonanie przyłącza c.o.,</li> <li>wykonanie węzła c.o. wraz z automatyką,</li> <li>wykonanie instalacji c.o., cwu,</li> <li>wymiana instalacji odgromowej,</li> <li>wymiana instalacji oświetlenia ciągów komunikacyjnych.</li> </ul> <p>Wartość inwestycji wyniosła 439 425,41 zł (dofinansowanie UE - 337 007,65 zł).</p>
34.	Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 38A	Administrator sp. z o.o. w Ełku	<p><b>Projekt w przygotowaniu</b></p> <p>W 2018 r. przygotowana została dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku. W 2020 r. nie prowadzono prac termomodernizacyjnych budynku.</p>
35.	Termomodernizacja budynku przy ul. Orzeszkowej 16, 18	Administrator sp. z o.o. w Ełku	<p><b>Projekt w przygotowaniu</b></p> <p>W 2021 r. planowane jest wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej i wewnętrznej instalacji c.o. budynku.</p>
36.	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 34	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt”	<p><b>Projekt w trakcie realizacji</b></p> <p>W 2018 r. wykonano docieplenie ściany budynku. W 2020 r. nie prowadzono prac termomodernizacyjnych budynku. Spółdzielnia posiada projekt termomodernizacji pozostałej, nieocieplonej części budynku.</p>

## STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stan realizacji
37.	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 36	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt”	<b>Projekt zrealizowany</b> Projekt zrealizowany w 2016 r. Inwestycja polegała na dociepleniu ściany podłużnej południowej oraz wymianie podłóży betonowych w loggiach. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 150 tys. zł.
38.	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 1	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt”	<b>Projekt zrealizowany</b> W 2017 r. ocieplono ścianę podłużną południową i wymieniono podłóża betonowe balkonów. Na inwestycję wydano 117 tys. zł.
39.	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 3	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt”	<b>Projekt w trakcie realizacji</b> W 2020 r. wykonano docieplenie ściany podłużnej wschodniej budynku. Na inwestycję wydano 101 806,86 zł. W 2021 r. docieplona zostanie ściana od strony balkonów.
40.	Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 9	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt”	<b>Projekt zrealizowany</b> W 2018 r. dokonano docieplenia ściany i wymiany podłóży betonowych na balkonach. Koszt inwestycji wyniósł 298 tys. zł.
41.	Termomodernizacja budynku przy ul. Gdańskiej 6	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt”	<b>Projekt w przygotowaniu</b> W ubiegłym roku nie prowadzono prac termomodernizacyjnych, natomiast przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w obrębie części wspólnych budynku.
42.	Termomodernizacja budynku przy ul. Gdańskiej 10	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt”	<b>Projekt w przygotowaniu</b> W ubiegłym roku nie prowadzono prac termomodernizacyjnych, natomiast przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w obrębie części wspólnych budynku.
43.	Termomodernizacja budynku przy ul. Gdańskiej 12	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt”	<b>Projekt w trakcie realizacji</b> W 2015 r. przeprowadzono remont elewacji z dociepleniem ścian od strony klatek schodowych V-VII. W 2018 r. docieplono ściany balkonów (IV-V klatka) wraz z remontem podłóży na balkonach. W 2020 r. nie prowadzono prac termomodernizacyjnych budynku. Spółdzielnia posiada projekt termomodernizacji pozostałej, nieocieplonej części budynku.

# STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stan realizacji
44.	Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 7	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt”	<b>Projekt zrealizowany</b> W 2018 r. zrealizowano docieplenie ściany i wymiany podłogi betonowych na balkonach. Koszt prac wyniósł prawie 273 tys. zł.
45.	Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 9A	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt”	<b>Projekt w trakcie realizacji</b> W 2015 r. docieplono ściany od strony klatek schodowych ( pod tarasem ). Na inwestycję wydano 27 tys. zł. W 2020 r. nie prowadzono prac termomodernizacyjnych budynku. Spółdzielnia posiada projekt termomodernizacji pozostałej, nieocieplonej części budynku.
46.	Prace rewitalizacyjne w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej w Ełku	Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej	<b>Projekt w trakcie realizacji</b> W 2020 r. nie były prowadzone prace modernizacyjne budynku.
47.	Przebudowa i adaptacja poddasza nad Szkołą Podstawową nr 2	Gmina Miasto Ełk, Międzyszkolny Klub Sportowy „Żak”, Szkoła Podstawowa nr 2	<b>Projekt nierealizowany</b> W 2017 r. rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji technicznej. W trakcie realizacji zamówienia wykonawca wskazał, że konieczne jest dodatkowe wzmocnienie konstrukcji budynku, przedstawiając wstępny koszt realizacji takiej inwestycji. Koszt ten (szacunkowo w granicach 7 mln zł) nie był możliwy do poniesienia przez Gminę Miasto Ełk. W związku z powyższym podjęta została decyzja o odstąpieniu od sporządzenia dokumentacji.
48.	To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce	Fundacja „Human Lex Instytut”	<b>Projekt w trakcie realizacji</b> Podjęte zostały działania w postaci pracy streetowrkerów, animatorów, wychowawców, psychologa środowiskowego i terapeuty w zdiagnozowanych miejscach obszaru rewitalizacji. W główne działania projektu są włączeni rodzice i lokalna społeczność, jako liderzy lokalni, oraz osoby wspierające i decyzyjne w związku z prowadzonymi elementami animacyjnymi, psychospołecznymi i zawodowymi.



# STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stan realizacji
			<p>Główne działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• praca podwórkowa – ul. Orzeszkowej oraz Mickiewicza (w tym podwórka poboczne);</li> <li>• działania oparte o zajęcia terapeutyczne – praca psychologa i psychologa środowiskowego,</li> <li>• zajęcia z dogoterapii,</li> <li>• obóz profilaktyczny,</li> <li>• wyjazdy integracyjne,</li> <li>• piknik rodzinny na ul. Orzeszkowej.</li> </ul> <p>Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE (RPO WiM 2014-2020) w kwocie 380 tys. zł. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 148 000 zł. Projekt jest realizowany do 30.06.2021 r.</p>
49.	Renowacja zabytkowego budynku kościoła oraz otoczenia	Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów	<p><b>Projekt w trakcie realizacji</b></p> <p>W okresie sprawozdawczym prowadzone była adaptacja i modernizacja budynku zborowego na Chrześcijańskie Centrum Wsparcia Rodziny. Wykonano 70% prac.</p> <p>Projekt „Rewitalizacja obiektów Kościoła Baptystycznego w Ełku wraz z otoczeniem” otrzymał 1,97 mln zł dofinansowanie ze środków UE (RPO WiM 2014-2020). Wartość całego projektu wynosi 2,57 mln zł.</p> <p>Na realizację inwestycji wydano w 2020 r. kwotę 968 196,50 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dofinansowanie UE – 740 670,29 zł</li> <li>• budżet państwa – 82 296,76 zł;</li> <li>• wkład własny – 145 229,45 zł.</li> </ul>
50.	Szkoła przedsiębiorczości	Stowarzyszenie Adelfi	<b>Projekt nierealizowany</b>

# STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stan realizacji
51.	Zagospodarowanie skweru im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” przy ul. Słowackiego	Gmina Miasto Ełk	<p><b>Projekt w przygotowaniu</b></p> <p>Inwestycja ma sporządzoną koncepcję zagospodarowania i dokumentację projektową wraz pozwoleniem na budowę. Proces uzgadniania zakresu inwestycji był uspołeczniony – przeprowadzono konsultacje społeczne metodą planowania w przestrzeni oraz organizowano spotkania konsultacyjne w celu wyboru odpowiedniego wariantu i jego dopracowania. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi ok. 2,65 mln zł. W 2020 r. nie były realizowane działania w ramach projektu.</p>
52.	Modernizacja i przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	<p><b>Projekt w przygotowaniu</b></p> <p>Przygotowana jest koncepcja modernizacji i przebudowy biblioteki oraz dokumentacja techniczna. W ubiegłym roku został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z funduszy norweskich, jednak nie otrzymał wsparcia finansowego z tego źródła.</p>
53.	Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację	Gmina Miasto Ełk	<p><b>Projekt zrealizowany</b></p> <p>Koncepcja Gminy Miasta Ełk otrzymała dofinansowanie w konkursie „Modelowa rewitalizacja miast”, organizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Ełk razem z 19 innymi miastami z całego kraju był organizatorem modelowych działań rewitalizacyjnych, służących za przykład dla innych samorządów. Projekt trwał od 1 lipca 2016 r. do 31 października 2018 r.</p> <p>Ideą projektu było wypracowanie uniwersalnego i skutecznego modelu działań w zakresie ożywienia Śródmieścia Ełku, w celu zastopowania negatywnych zjawisk występujących w tym obszarze. W ramach projektu realizowane były m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultacje społeczne aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku;</li> <li>• Warsztaty kompetencji streetworkera (pedagoga ulicy);</li> <li>• Młodzieżowa Akademia Rewitalizacji (warsztaty dla dzieci i młodzieży);</li> <li>• Inicjatywy w ramach Programu Sąsiedzkiego (dofinansowanie miniprojektów-pomysłów mieszkańców);</li> <li>• Polityka funkcjonalna Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej;</li> </ul>

# STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stan realizacji
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programy aktywizacji zawodowej mieszkańców Śródmieścia;</li> <li>• Inwentaryzacja nieruchomości w Śródmieściu;</li> <li>• Koncepcje architektoniczno-urbanistyczne wybranych obszarów w Śródmieściu;</li> <li>• Dokumentacja techniczna dla wybranych przedsięwzięć;</li> <li>• Działania edukacyjne z zakresu rewitalizacji.</li> </ul> <p>Wartość projektu wyniosła 755 809,09 zł (dofinansowanie UE – 612 205,32 zł, budżet państwa – 68 022,81 zł, budżet miasta Ełk – 75 580,96 zł).</p>
54.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy rzeką Ełk a ul. Żeromskiego	Gmina Miasto Ełk	<p><b>Projekt w trakcie realizacji</b></p> <p>Na terenie skweru pomiędzy rzeką Ełk a ul. Żeromskiego zostały przeprowadzone w 2017 r. konsultacje społeczne metodą planowania w przestrzeni. W spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział ok. 100 mieszkańców ełckiego Śródmieścia i innych części miasta, którzy korzystają z tego terenu (np. placu zabaw). Seniorzy, dorośli, młodzież i dzieci przekazali wiele pomysłów związanych z tym, jak skwer mógłby wyglądać w przyszłości. Na podstawie propozycji mieszkańców powstała koncepcja zagospodarowania, której wizualizacja znajduje się w rozdziale 3. sprawozdania.</p> <p>Część planów zagospodarowania terenu została wykonana w 2018 r. w postaci ścieżki rowerowej biegnącej do ul. Żeromskiego i Placu Katedralnego (inwestycja opisana w projekcie nr 3. „Zagospodarowanie pustych przestrzeni dla rozwoju funkcji turystyczno – rekreacyjnych w mieście Ełk”). Dokonano również nasadzeń drzew wzdłuż brzegu rzeki Ełk na odcinku od ul. Wojska Polskiego do mostu pieszo-rowerowego.</p> <p>W 2020 r. nie prowadzono kolejnych działań inwestycyjnych na terenie skweru.</p>
55.	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku	Gmina Miasto Ełk	<p><b>Projekt w trakcie realizacji</b></p> <p>Projekt „Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych” otrzymał dofinansowanie z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 w kwocie 2 349 582,64 zł (całkowita wartość projektu - 2 764 214,87 zł). Zmodernizowany budynek będzie przeznaczony do celów społecznych na potrzeby działalności organizacji pozarządowych, instytucji kultury oraz mieszkańców Ełku. W budynku zagospodarowana zostanie m.in. sala główna ze sceną, pokoje biurowe oraz antresola. Zagospodarowany zostanie również teren wokół budynku.</p>

## STOPIEŃ REALIZACJI PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Lp.	Tytuł projektu	Beneficjent	Stan realizacji
			<p>Zakres prac obejmuje m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• wymianę pokrycia dachowego,</li><li>• wykonanie i montaż fasad szklanych z nadrukiem,</li><li>• renowację istniejącej klatki schodowej,</li><li>• przebudowę pomieszczeń,</li><li>• wykonanie termomodernizacji budynku,</li><li>• wykonanie iluminacji budynku z podświetleniem szklanej witryny, (iluminowana będzie ściana z grafiką bokserów).</li></ul> <p>Roboty budowlane rozpoczęto pod koniec 2020 r. z planowanym terminem zakończenia na październik 2021 r.</p>

## 2. Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźników sytuacji społeczno-gospodarczej, tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione, prowadzona jest dla obszaru rewitalizacji „Śródmieście”, jak i całego Ełku. Wynika to z przyjętej metodologii wyznaczania obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. Zgodnie z nią, **za negatywne zjawisko uznaje się sytuację, gdy dany miernik wskazuje na niski poziom rozwoju lub dokumentuje silną dynamikę spadku poziomu rozwoju w odniesieniu do wartości referencyjnej dla całego miasta.** Takie podejście umożliwi ocenę, czy i w jakim stopniu sytuacja w obszarze rewitalizacji ulega poprawie. Część wskaźników jest przedstawiana jedynie dla Śródmieścia bądź dla całego Miasta (gdy niemożliwe lub niecelowe jest pozyskanie danych wyłącznie dla obszaru rewitalizacji).

W tabelach zostały zaprezentowane dane wyjściowe określone na etapie sporządzania programu<sup>1</sup>, dane za lata obowiązywania programu oraz wartości docelowe, które mają zostać osiągnięte na koniec 2023 r. Przy wskaźnikach wykorzystanych w diagnozie programu do wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, porównujących sytuację w Śródmieściu do średniej miejskiej, zaznaczono:

- **Kolorem zielonym** – stan, gdy miernik w danym roku sprawozdawczym wskazuje na wyższy poziom rozwoju Śródmieścia w odniesieniu do średniej dla całego Ełku (niewystępowanie negatywnego zjawiska w danym aspekcie),
- **Kolorem czerwonym** - stan, gdy miernik w danym roku sprawozdawczym wskazuje na niższy poziom rozwoju Śródmieścia w odniesieniu do średniej dla całego Ełku (występowanie negatywnego zjawiska w danym aspekcie).

Dodatkowo w systemie monitorowania uwzględniono **wskaźniki mierzące skalę i efekty projektów rewitalizacyjnych**, gdzie źródłem danych są beneficjenci tych projektów. Wartości tych wskaźników nie należy więc utożsamiać z ogółem działań podejmowanych w obszarze rewitalizacji w danym roku – odnoszą się one wyłącznie do przedsięwzięć zapisanych w programie.

Liczba ludności obszaru rewitalizacji „Śródmieście”, wg zameldowań, na koniec 2020 r. wyniosła 15 812 i zwiększyła się wobec 2019 r. o 145 osób. W całym mieście liczba zameldowanych mieszkańców zmalała o 540.


Tabela 1 Liczba osób zameldowanych na koniec 2020 r. (zameldowania czasowe i stałe, źródło: Urząd Miasta Ełku, Referat Spraw Obywatelskich).

Śródmieście	Ełk
15 812 osób	58 649 osób

<sup>1</sup>W zależności od typu danych były to wartości za 2014 r. lub 2015 r. W przypadku danych w celu 6 przyjęto wartości bazowe (2013 r.) i wartości docelowe, ustalone w dokumencie „Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r.” (tzw. program niskoemisyjny), w celu zachowania spójności pomiędzy oboma programami.

# ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Wykres 2 Liczba osób zameldowanych w Śródmieściu (pobyt stały i czasowy, źródło: Urząd Miasta Ełku, Referat Spraw Obywatelskich).

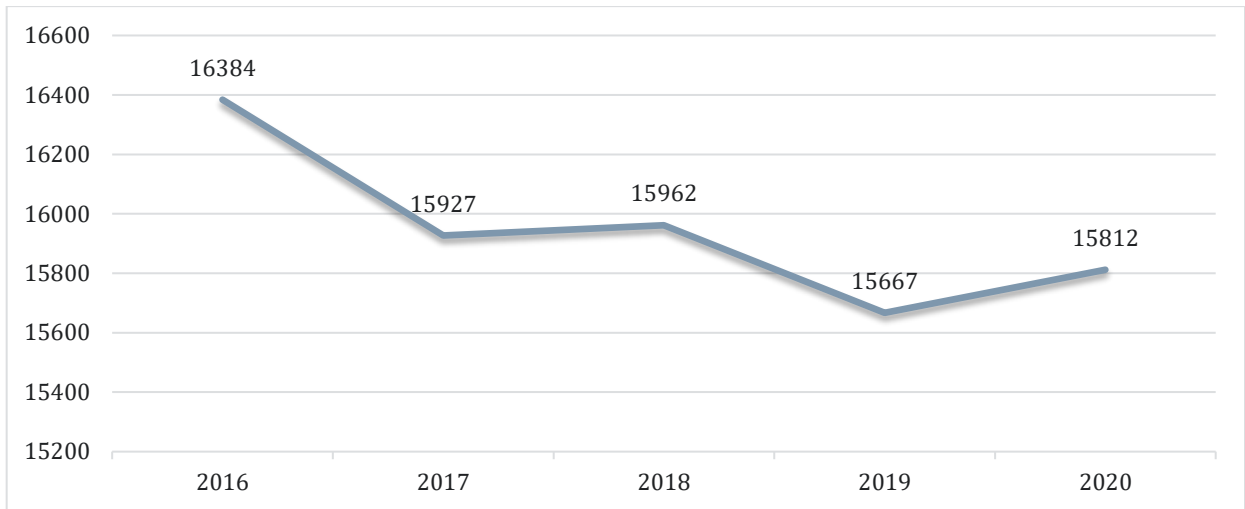



# ANALIZA WSKAŹNIKOWA


Tabela 2 Wskaźniki celu 1 „Zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości”.

Cel 1 – Zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości.									
Nazwa wskaźnika	Miernik	Źródło Informacji	Śródmieście						Miasto Ełk
			Wartość bazowa	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców (w danym roku)	szt.	Urząd Miasta Ełku, Wydział Organizacyjny, Referat Działalności Gospodarczej	6,62	6,32	6,72	7,12	7,46	7,15	6,13
Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 100 mieszkańców (w danym roku)	osoby	Powiatowy Urząd Pracy	5,55	4,30	3,49	3,38	2,81	3,75	1,66
Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym na 100 mieszkańców (w danym roku)	osoby	Powiatowy Urząd Pracy	2,44	0,73	1,91	1,81	2,30	2,54	1,18
Liczba powstałych przedsiębiorstw społecznych (narastająco)	szt.	beneficjenci projektów wpisanych do Programu	nd	0	0	0	0	0	nd
Liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem objętych wsparciem w ramach projektów dot. aktywizacji zawodowej (narastająco)	osoby	beneficjenci projektów wpisanych do Programu	nd	0	0	32	164	180	
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w ramach projektów dot. aktywizacji zawodowej (narastająco)	osoby	beneficjenci projektów wpisanych do Programu	nd	0	0	0	31	31	

## Komentarz – wskaźniki celu 1

Cel 1 „Zwiększenie zatrudnienia i przedsiębiorczości” zakłada m.in.: aktywne działania skierowane do osób długotrwale pozostających bez pracy w celu poprawy możliwości znalezienia zatrudnienia. Analiza wskaźników wskazuje, że liczba długotrwale bezrobotnych mieszkających w Śródmieściu, na koniec 2020 r., wynosiła 593 osoby i wzrosła przez rok o 152 osoby. Długotrwale bezrobotni z obszaru rewitalizacji stanowią 60,8% tej grupy osób w Ełku. Można domniemywać, że gospodarcze skutki pandemii koronawirusa mocno dotknęły zwłaszcza osoby o najcięższej sytuacji na rynku pracy, z najniższym wykształceniem. W ciągu roku liczba bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym, zamieszkujących Śródmieście, wzrosła o 40 osób. Łącznie było to 401 osób, co stanowiło 58% wartości dla całego Ełku.

Tabela 3 Dane dot. osób bezrobotnych w Ełku. (źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ełku).

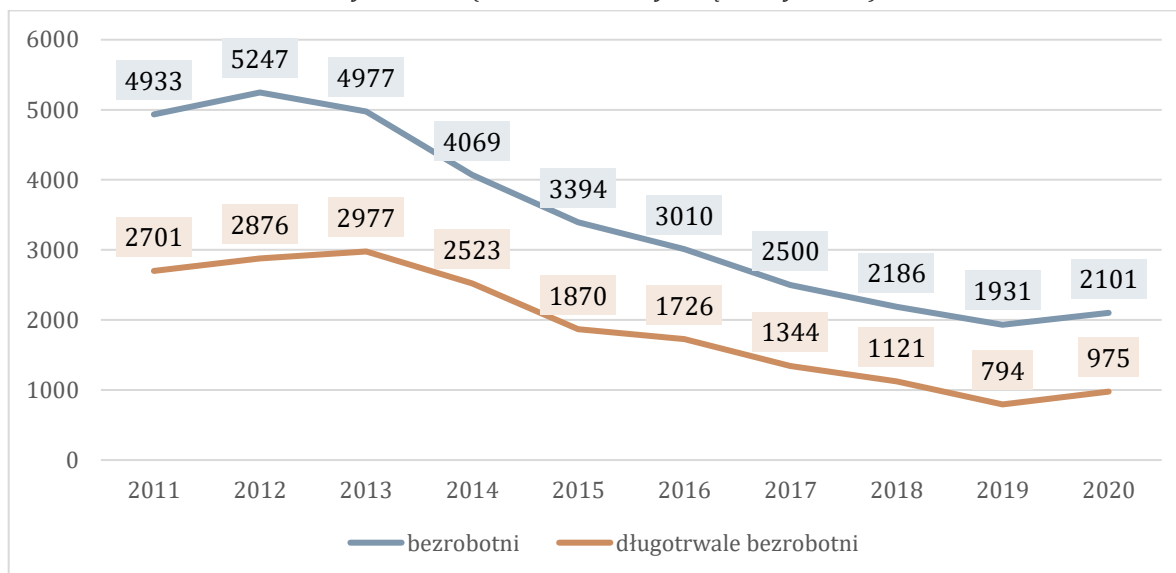

Wskaźniki bezrobocia dla obszaru rewitalizacji Śródmieście są gorsze od średniej wartości dla całego miasta. Oznacza to, że nadal mamy do czynienia z negatywnym zjawiskiem w tym aspekcie w obszarze rewitalizacji. Zaplanowane w programie projekty z zakresu aktywizacji zawodowej (a także projekty ogólnomiejskie) z powodu dynamicznie zmieniającej się sytuacji związanej z COVID-19 były w ubiegłym roku dostosowywane do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń. Niektóre działania nie mogły zostać zrealizowane, dlatego przeniesiono je na kolejny rok.

Dane za 2021 r. pokażą, czy wzrost bezrobocia był jednoroczną anomalią spowodowaną szczególną sytuacją społeczno-gospodarczą w 2020 r. Niemniej jednak pandemia pokazała, że w okresie kryzysu gospodarczego osoby o najniższych kwalifikacjach zawodowych najbardziej odczuwają jego skutki. Z tego powodu należy wzmocnić działania prowadzące do optymalnego przygotowania tych osób do wejścia lub utrzymania się na rynku pracy. W szczególności wysiłki te powinny być skoncentrowane na mieszkańcach Śródmieścia, gdzie występuje kumulacja negatywnych zjawisk związanych z zatrudnieniem.

# ANALIZA WSKAŹNIKOWA

## Cel 2 – Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych.

Nazwa wskaźnika	Miernik	Źródło Informacji	Śródmieście					Miasto Ełk	
			Wartość bazowa	2016	2017	2018	2019	2020	2020 r.
Liczba ofiar przemocy w rodzinie na 100 mieszkańców (w danym roku)	osoby	Komenda Powiatowa Policji w Ełku	0,15	0,70	0,45	0,38	0,41	<b>0,39</b>	0,28
Osoby, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców (w danym roku)	osoby	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku	5,69	4,10	4,37	2,75	2,62	<b>2,80</b>	1,54
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (narastająco)	osoby	beneficjenci projektów wpisanych do Programu	nd	0	0	57	269	394	nd
Liczba dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (narastająco)	osoby	beneficjenci projektów wpisanych do Programu	nd	0	0	32	123	223	
Liczba osób starszych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (narastająco)	osoby	beneficjenci projektów wpisanych do Programu	nd	0	0	20	33	33	

# ANALIZA WSKAŹNIKOWA

## Cel 2 – Zintegrowanie mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz ograniczenie patologii społecznych.

Nazwa wskaźnika	Miernik	Źródło Informacji	Śródmieście					Miasto Ełk	
			Wartość bazowa	2016	2017	2018	2019	2020	2020 r.
Liczba osób z uzależnieniami zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (narastająco)	osoby	beneficjenci projektów wpisanych do Programu	nd	Dane dot. osób uzależnionych są informacją wrażliwą, niemożliwą do pozyskania w ramach projektów. W związku z tym wskaźnik nie może być monitorowany.					
Liczba osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (narastająco)	osoby	beneficjenci projektów wpisanych do Programu	nd	0	0	3	30	65	nd
Liczba podjętych/wspartych inicjatyw lokalnych (narastająco)	szt.	Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku; beneficjenci projektów wpisanych do Programu	nd	6	9	10	39	52	33 <sup>2</sup>

<sup>2</sup> Dane dla pozostałej części miasta (poza obszarem rewitalizacji Śródmieście) – narastająco od 2016 r.


## Komentarz – wskaźniki celu 2

W celu 2 dąży się do włączenia społecznego grup dotkniętych różnego rodzaju problemami i całych rodzin poprzez podjęcie zróżnicowanych przedsięwzięć w zakresie aktywnej integracji, które umożliwią zmianę dotychczasowego sposobu życia poszczególnym osobom i całym społecznościom.

W 2020 r. odnotowano niewielkie zmniejszenie problemu **przemocy w rodzinie**. Wg danych Komendy Powiatowej Policji w Ełku, w obszarze rewitalizacji zjawiskiem tym dotkniętych było 61 osób (-3 rok do roku), co stanowi nieco ponad 1/3 wszystkich takich przypadków w Ełku. W całym mieście liczba osób doświadczających przemocy zmalała o 26 do poziomu 164 osób. Liczne działania na rzecz walki z przemocą realizuje ECRS Stajnia, gdzie w ubiegłym roku funkcjonowały Poradnia Rodzinna, Punkt Konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonych Przystępstwem. Ponadto ECRS Stajnia realizowało projekt dofinansowany ze środków z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Ełk – Bezpieczna Rodzina”.<sup>3</sup>

W obszarze rewitalizacji nastąpił nieznaczny **wzrost wskaźnika ubóstwa**, co najprawdopodobniej ma związek z opisanym w Celu 1 pogorszeniem sytuacji na rynku pracy. W ubiegłym roku z pomocy społecznej, z powodu ubóstwa, skorzystało 442 mieszkańców obszaru rewitalizacji, co stanowiło prawie połowę ogólnej liczby (49%). Warto zaznaczyć, że w Śródmieściu zjawisko to nasiliło się (+31 osób), natomiast ogólnie w Ełku mniej osób skorzystało z pomocy społecznej z tego powodu (-47).

Wykres 3 Liczba osób, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej z powodu ubóstwa (źródło: MOPS).

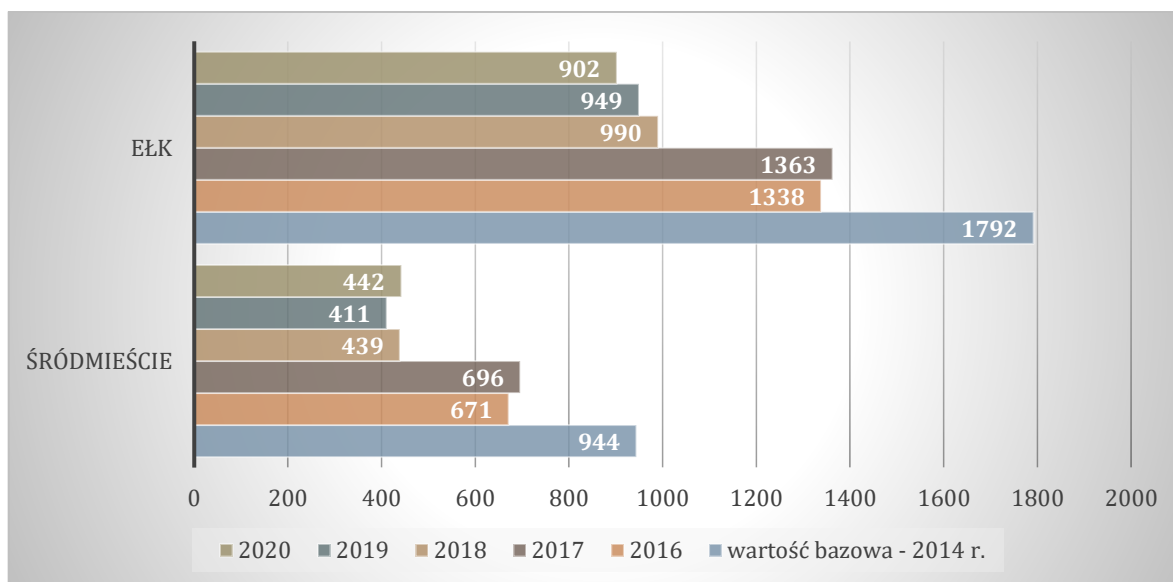

W ubiegłym roku trwała realizacja projektów rewitalizacyjnych ukierunkowanych na wsparcie osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem, co potwierdzają wskaźniki wskazane w tabeli Celu 2. Pandemia COVID-19 utrudniła pełną realizację planów projektowych, w tym w zakresie inicjatyw lokalnych. Konieczne było przeniesienie części działań na 2021 r.

<sup>3</sup> Więcej informacji o działalności ECRS Stajnia w rozdziale 3.

Uwagę zwraca niewielka liczba osób starszych, uczestniczących w projektach rewitalizacyjnych, zwłaszcza że Śródmieście jest najbardziej zaawansowaną wiekowo częścią Ełku. Wśród gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną najliczniejszą grupę tworzą gospodarstwa jednoosobowe oraz rodziny emerytów i rencistów. Wydaje się zatem, że działalność takich podmiotów jak Klub Seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku czy też publicznych instytucji pomocy społecznej powinna być w większym stopniu ukierunkowana na aktywizację osób starszych zamieszkujących Śródmieście. Obecnie w programie rewitalizacji nie ma żadnego projektu skierowanego do tej grupy. Oczywiście realizowane są różne inicjatywy/projekty ogólnomiejskie, obejmujące również osoby z obszaru rewitalizacji, jednak niezbędne wydaje się wsparcie dedykowane tylko seniorom ze Śródmieścia.



# ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Cel 3 – Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych									
Nazwa wskaźnika	Miernik	Źródło Informacji	Śródmieście						Miasto Ełk
			Wartość bazowa	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Osoby, którym zrealizowano świadczenia pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby na 100 mieszkańców (w danym roku)	osoby	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku	4,17	3,42	3,96	3,23	3,64	3,29	2,01
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych	szt.	MOPS, Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej, PCPR	nd	0	0	3	3	3	nd
Liczba usług świadczonych przez podmioty wsparte w programie (w danym roku)	szt.	Wydział Polityki Społecznej UM Ełku, MOPS, PCPR	76	76	77	80	81	75	nd
Liczba osób świadczących usługi wspierające animację lokalną (animatorzy lokalni, streetworkerzy itp.) – w danym roku	osoby	beneficjenci projektów wpisanych do Programu	4	5	25	17	38	41	nd
Nazwa wskaźnika	Miernik	Źródło Informacji	Śródmieście	Miasto Ełk					
				wartość bazowa	2016	2017	2018	2019	2020
Liczba osób, które skorzystały z działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej (w danym roku)	osoby	Wydział Polityki Społecznej UM Ełku	nd	5 748	8 720	8 950	8 795	4 658	7 284
Liczba osób, które skorzystały z usług społecznych świadczonych przez podmioty wsparte w programie (w danym roku)	osoby	Wydział Polityki Społecznej UM Ełku, MOPS, PCPR	nd	21 956	22 111	22 512	16 875	12 588	9 842

## Komentarz – wskaźniki celu 3

Cel nr 3 w głównej mierze zakłada **wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za realizację działań z zakresu świadczenia usług społecznych**. W „Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” znalazły się projekty obejmujące przebudowę/adaptację budynków następujących instytucji, świadczących usługi społeczne<sup>4</sup>:


- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej Stajnia;
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Wszystkie ww. inwestycje zostały zrealizowane. Poprawa stanu technicznego budynków ma wpłynąć na polepszenie warunków pracy oraz poprawę oferty usług społecznych. Również w tym przypadku w 2020 r. pandemia koronawirusa ograniczyła działalność instytucji pomocy społecznej. Liczba świadczonych usług, po 3 latach wzrostu, wróciła do wartości z lat 2015-2016. Tym samym zmalała liczba mieszkańców objętych wsparciem, na co dodatkowo miała wpływ stale malejąca grupa osób kwalifikujących się do wsparcia w ramach pomocy społecznej. Usługi skierowane jedynie do mieszkańców Śródmieścia realizowane były przede wszystkim w ramach projektów rewitalizacyjnych, ujętych w programie (opisy projektów znajdują się w rozdziale 1).

Sytuacja pandemiczna nie wpłynęła negatywnie na działalność animatorów i pedagogów ulicy. W obszarze rewitalizacji **pracę metodą streetworkingu prowadziło 41 osób**, w większości w ramach projektów rewitalizacyjnych dofinansowanych z funduszy unijnych. Dla przykładu w projekcie „Lokalne perspektywy” 12 streetworkerów przepracowało łącznie 4 138 godz. z grupą 12 osób – dziećmi, rodzicami, całymi rodzinami. Praca odbywała się w systemie od 10 do 60 godz. miesięcznie na podwórkach z obszaru rewitalizacji.

W 2020 r. w Ełku znacząco spadł (-8,7%) wskaźnik dot. osób, którym zrealizowano świadczenia pomocy społecznej z powodu **długotrwałej choroby**. Niemniej Śródmieście jest obszarem kumulacji tego zjawiska – mieszka tu 44,1% wszystkich beneficjentów świadczeń pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby. Dystans w stosunku do średniej miejskiej jest na tyle duży, że nadal w Śródmieściu występuje negatywna sytuacja w tym aspekcie społecznym. Przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi w strukturze demograficznej. Obszar rewitalizacji jest najbardziej zaawansowaną wiekowo częścią miasta.

Wykres 4 Osoby, którym zrealizowano świadczenia pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby (źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).



<sup>4</sup> Szczegółowe informacje w rozdziale „Stopień realizacji podstawowych projektów rewitalizacyjnych”


# ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Cel 4 – Podniesienie społecznej i gospodarczej atrakcyjności przestrzeni publicznych									
Nazwa wskaźnika	Miernik	Źródło Informacji	Śródmieście						Miasto Ełk
			Wartość bazowa	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Poziom zrewitalizowania obszaru (powierzchnia, narastająco) <sup>5</sup>	%	beneficjenci projektów wpisanych do Programu	5,81	5,81	6,67	8,94	8,94	9,01	nd
Otwarta przestrzeń utworzona lub zrekultywowana na obszarach miejskich (narastająco)	m <sup>2</sup>	beneficjenci projektów wpisanych do Programu	nd	58,4 m <sup>2</sup>	14 798,9	53 915,25	53 915,25	55 115,25	143 413,57
Długość wybudowanych/zmodernizowanych dróg (narastająco)	km	Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku	nd	0,702	0,702	0,702	1,427	1,427	8,057

<sup>5</sup> Maksymalny założony poziom, określony na podstawie projektów rewitalizacyjnych, wynosi 10,17%

## Komentarz – wskaźniki celu 4

W ubiegłym roku przestrzeń publiczna w Śródmieściu Ełku powiększyła się o park muzyczny przy Ełckim Centrum Kultury (teren pomiędzy budynkiem ECK a ul. Zamkową). Pojawiła się tam niewielka scena na koncerty, potańcówki itp. wydarzenia. Najmłodszy użytkownicy mogą skorzystać z plenerowych instrumentów muzycznych i zabawek. W ramach inwestycji przeprowadzono również nasadzenia drzew, krzewów i traw oraz montaż elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci, lampy parkowe, stojaki rowerowe).

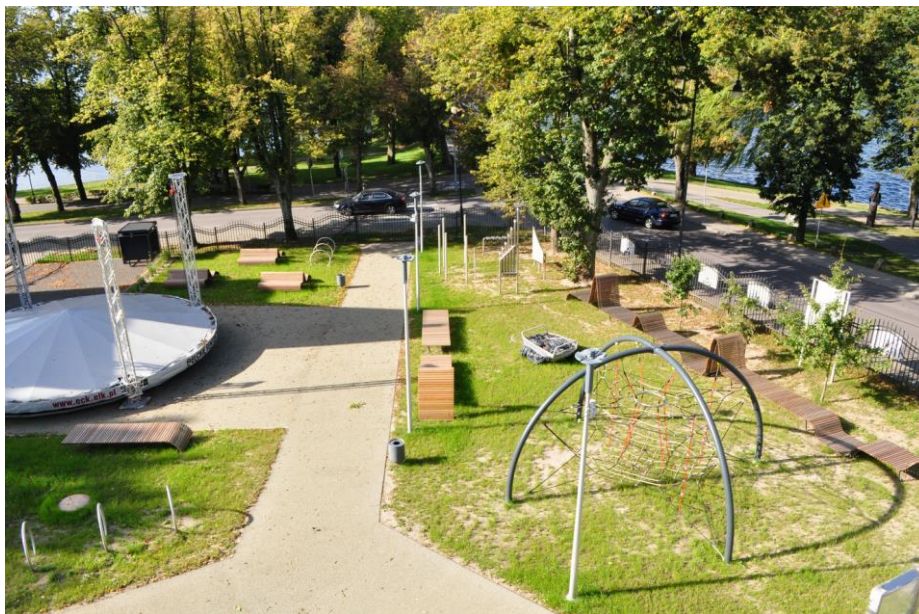

Zdjęcie 1 park muzyczny przy Ełckim Centrum Kultury (fot. ECK).

Spośród projektów zaplanowanych w Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023, związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych, nie zrealizowano jeszcze inwestycji na skwerze im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” przy ul. Słowackiego. Inwestycja ma sporządzoną koncepcję zagospodarowania i dokumentację projektową wraz pozwoleniem na budowę.



Rysunek 2 Wizualizacja zagospodarowania skweru przy ul. Słowackiego (UM Ełku).

# ANALIZA WSKAŹNIKOWA

## Cel 5 – Wzrost potencjału turystycznego, sportowo-rekreacyjnego i kulturalnego w oparciu o zasoby przyrodnicze i dziedzictwa kulturowego

Nazwa wskaźnika	Miernik	Źródło Informacji	Miasto Ełk					
			Wartość bazowa	2016	2017	2018	2019	2020
Udział całorocznych miejsc noclegowych w ogólnej liczbie dla województwa warmińsko-mazurskiego (w danym roku)	%	BDL GUS	1,38%	2,42%	1,26%	2,40%	2,44%	2,67%
Liczba noclegów przypadających na 1 turystę zagranicznego (w danym roku)	szt.	BDL GUS	3,26	2,83	1,83	1,88	1,68	1,99
Liczba produktów turystycznych	szt.	Urząd Miasta Ełku	28	30	36	38	37	37
			Śródmieście					
			Wartość bazowa	2016	2017	2018	2019	2020
Zwiedzający muzea i oddziały na 1000 mieszkańców województwa (w danym roku)	osoby	BDL GUS	22,48	25,27	30,89	35,59	56,12	20,18
Wzrost liczby odwiedzin miejsc należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne, wspartych w programie (w porównaniu do 2015 r.)	szt.	Beneficjenci projektów wpisanych do Programu	nd	3 9250	11 930	18 479	47 476	-3 783
Liczba budynków zabytkowych poddanych modernizacji (wpisanych do rejestru zabytków) - narastająco	szt.	Beneficjenci projektów wpisanych do Programu	nd	4	4	5	5	5




## Komentarz – wskaźniki celu 5

Cel 5 zakłada **zwiększenie atrakcyjności turystycznej Ełku**. Środowisko naturalne jest jednym z kluczowych zasobów wpływających na atrakcyjność miasta jako miejsca do życia i odwiedzania. Zaplanowane działania mają stać się impulsem do przyciągnięcia turystów, aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Ełku oraz tworzenia nowych firm w branżach powiązanych z turystyką. Będą również służyły mieszkańcom Ełku dla realizacji ich inicjatyw czy też spędzania czasu wolnego.

Dane GUS wskazują na stabilizację wskaźników dot. bazy turystycznej i znaczące zmniejszenie ruchu turystycznego w Ełku (przede wszystkim z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów noclegowych wynikających z COVID-19). W ubiegłym roku w mieście było 8 obiektów w noclegowych oferujących 778 miejsc (w tym 7 obiektów w całorocznych, 628 miejsc). W 2020 r. Ełk odwiedziło 14 475 turystów (czyli o 6 652 więcej niż w 2019 r.), w tym 1 148 turystów z zagranicy. Turyści skorzystali z 33 345 noclegów (-14 447 rok do roku). Średnia długość pobytu turysty w naszym mieście wynosiła 2,30 dni (1,99 w przypadku osób z zagranicy).

Wykres 5 Liczba turystów i udzielonych im noclegów w Ełku w latach 2015-2020 (źródło: BDL GUS).

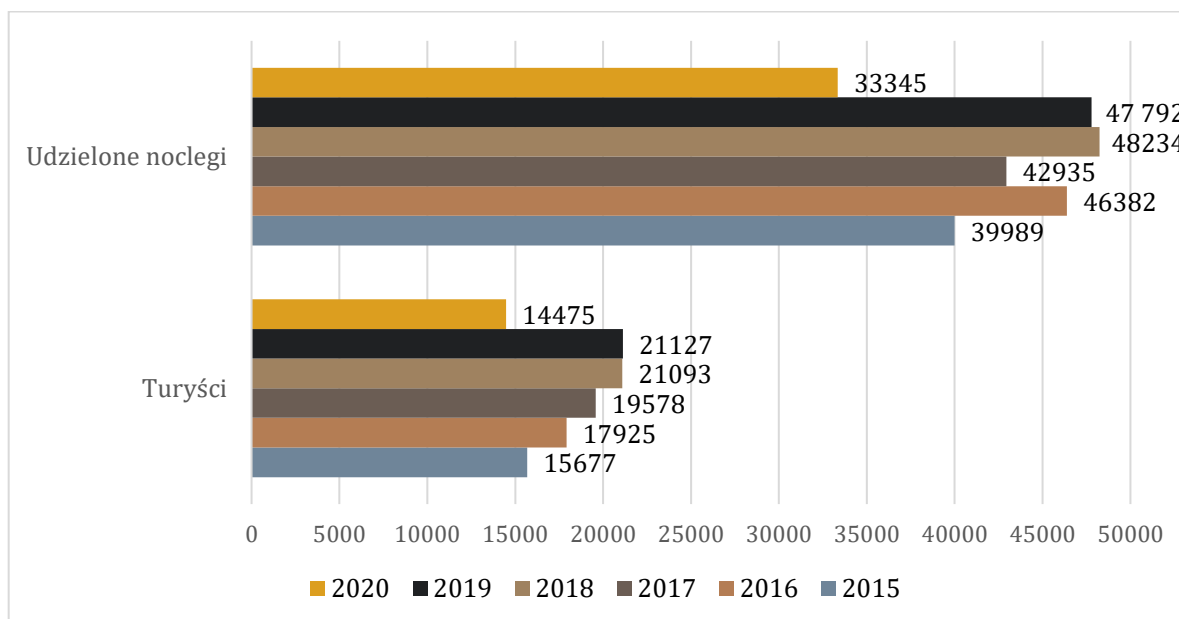

Kultura i dziedzictwo historyczne są ważnym elementem polityki rozwoju miasta oraz budowania jego tożsamości. W programie rewitalizacji przewidziano realizację projektów zmierzających do podniesienia atrakcyjności turystycznej trzech największych instytucji kultury w Ełku: Muzeum Historycznego w Ełku (w oparciu o ofertę Ełckiej Kolei Wąskotorowej), Ełckiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej. W ubiegłym roku ECK zakończyło inwestycję polegającą na budowie nowej sali widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pod park muzyczny. Ma to się w przyszłości przełożyć na urozmaicenie oferty kulturalnej i przyciągnięcie większej rzeszy odbiorców.

Muzeum Historyczne w Ełku zakończyło główne prace modernizacyjne swoich budynku i terenu w kompleksie EKW w 2018 r. Liczba odwiedzających muzeum w 2020 r. wyniosła 28,6 tys. osób

# ANALIZA WSKAŹNIKOWA

i zmalała w ciągu roku o ponad 51 tys. osób z powodu zamknięcia i ograniczeń wywołanych koronawirusem.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku czyni starania o znalezienie źródła finansowania modernizacji budynku przy ul. Armii Krajowej 17B (przygotowana jest dokumentacja techniczna).

W 2020 r. udzielono 3 dotacji z budżetu miasta na renowację ełckich zabytków dla następujących wnioskodawców<sup>6</sup>:

<b>I.p.</b>	<b>Nazwa Beneficjenta</b>	<b>Zakres prac</b>	<b>Kwota inwestycji</b>	<b>Udzielona kwota dotacji</b>
1.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 30	Remont elewacji (docieplenie, wykonanie tynków, malowanie, naprawa rynien i rur spustowych, renowacja cokołu, nadproży okiennych, stolarki okiennej i drzwiowej)	105 597,71 zł	50 000,00 zł
2.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Słowackiego 23	Remont dachu, montaż łąw kominiarskich, wymiana podbitki dachowej, wymiana rynien i rur spustowych, udrożnienie przewodów kominowych, renowacja stolarki okiennej oraz drzwi do klatki schodowej, renowacja barier balkonowych, docieplenie ścian szczytowych, wymiana okien klatki schodowej, renowacja gzymsów oraz tynków zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich, wykonanie kłap do studzienek piwnicznych	290 366,16 zł	51 000,00 zł
3.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Orzeszkowej 14	Remont elewacji frontowej od ulicy (czyszczenie, impregnacja, uzupełnienie ubytków), remont elewacji ścian szczytowych oraz od podwórka (docieplenie), remont bramy-tunełu (docieplenie na stropie, wyrównanie powierzchni ścian oraz wykonanie tynku mozaikowego)	188 636,86 zł	49 000,00 zł

<sup>6</sup> Od 2019 r. o dotacje mogą ubiegać się również obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków.



# ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Cel 6 - Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Zwiększenie efektywności energetycznej									
Nazwa wskaźnika	Miernik	Źródło Informacji	Śródmieście						Miasto Ełk
			Wartość bazowa	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Średnie jednostkowe roczne zużycie energii w grupie budynków użyteczności publicznej (w danym roku)	kWh/m <sup>2</sup> /rok	Urząd Miasta Ełku, Wydział Mienia Komunalnego	153	141	140	138	135	110	135
Liczba zmodernizowanych budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych (narastająco)	szt.	Administrator Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt”, Urząd Miasta Ełku – Wydział Mienia Komunalnego, Starostwo Powiatowe w Ełku	nd	27	52	74	96	113	nd
Nazwa wskaźnika	Miernik	Źródło Informacji	Miasto Ełk						
			Wartość bazowa	2016	2017	2018	2019	2020	
Roczne zużycie energii elektrycznej przez system oświetlenia miejskiego do liczby punktów świetlnych	MWh/punkt/rok	Urząd Miasta Ełku, Wydział Mienia Komunalnego	Wartość bazowa – 0,704	0,553	0,519	0,497	0,477	0,48	

## Komentarz – wskaźniki celu 6

Najwięcej budynków wybudowanych w Ełku przed 1989 r. znajduje się w „Śródmieściu”. Duże są zwłaszcza potrzeby termomodernizacyjne. W celu 6 zaplanowano więc realizację inwestycji poprawiających stan techniczny budynków, które przełożą się na efekty społeczne w postaci lepszych warunków życia mieszkańców „Śródmieścia” i wyższej jakości usług publicznych, a także poprawią stan środowiska. Jest to jeden z warunków przeprowadzenia skutecznych działań aktywizacyjnych i integracyjnych społeczności obszaru rewitalizacji.

W ubiegłym roku, w Śródmieściu Ełku, różnego rodzaju pracom termomodernizacyjnym poddano 17 budynków zarządzanych przez Administrator Sp. z o.o., Spółdzielnię Mieszkaniową „Świt” i Gminę Miasto Ełk (w tym przedszkola). W ciągu ostatnich 5 lat w Śródmieściu Ełku pracom termomodernizacyjnym objęto już łącznie 113 budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej.

*Tabela 4 Budynki wielorodzinne w Śródmieściu poddane pracom termomodernizacyjnym w latach 2016-2020 (źródło: SM „Świt”, Administrator Sp. z o.o.).*

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt"	Administrator Sp. z o.o.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Armii Krajowej 9, 48</li> <li>• Gdańska 12</li> <li>• Gizewiusza 10A</li> <li>• Kościuszki 10, 12</li> <li>• Mickiewicza 1, 7</li> <li>• Skiorskiego 12A</li> <li>• Wawelska 27</li> <li>• Wojska Polskiego 36, 40, 40A, 44, 44A, 46, 67</li> <li>• Żeromskiego 1, 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Maja 5</li> <li>• Armii Krajowej 6, 8, 15, 20, 27, 30, 33, 38, 40</li> <li>• Chopina 3, 11, 12, 19, 21, 23</li> <li>• Czarna 1</li> <li>• Gdańska 11, 22/24</li> <li>• Gdańska 2/Mickiewicza 21</li> <li>• Kościuszki 4, 8, 20</li> <li>• Magazynowa 1, 2</li> <li>• Mickiewicza 1, 9, 14, 15, 22, 27, 28, 31, 32, 34, 38, 37 i 39, 39A</li> <li>• Orzeszkowej 5, 6A, 10, 14, 14A, 19, 22, 24, 24A</li> <li>• Sikorskiego 8</li> <li>• Słowackiego 1, 4, 6, 8, 9, 23</li> <li>• Świackiego "Sępa" 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10</li> <li>• Toruńska 2</li> <li>• Wawelska 1, 3, 4, 6, 8, 9, 13</li> <li>• Wojska Polskiego 1 i 1A, 1B, 4, 5A, 6, 10, 18, 20, 24, 25, 33, 33A, 37, 42, 57, 61, 63</li> </ul>

# ANALIZA WSKAŹNIKOWA


Zdjęcie 2 Zdjęcia budynków przedszkoli miejskich Świątełko i Niezapominajka po termomodernizacji (fot. UM Ełk).



Średnie jednostkowe roczne zużycie energii w grupie budynków użyteczności publicznej, zlokalizowanych w Śródmieściu, zmalało kolejny rok z rzędu i jest niższe niż średnia ogólnomiejska. Przekłada się to na jeszcze lepszą jakość powietrza. Pomiary stacji monitoringu powietrza WIOŚ<sup>7</sup> wykazały, że w 2020 r. odnotowano 9 dni, w których przekroczony został 24-godzinny poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 (norma dopuszcza 35 dni takich przekroczeń w roku). W 2019 r. takich dni było 13.

Zużycie energii elektrycznej przez system oświetlenia miejskiego utrzymało się na poziomie z 2019 r. Miasto Ełk od kilku lat dynamicznie modernizuje oświetlenie uliczne. Energooszczędne punkty świetlne LED stanowiły w 2020 r. ok. 40% wszystkich punktów świetlnych w mieście. Dla porównania w 2015 r. wartość ta wynosiła zaledwie 3,28%. W wyniku modernizacji i konserwacji oświetlenia ulicznego odnotowano znaczną oszczędność w zużyciu energii elektrycznej, co przełożyło się na zmniejszenie kosztów.

Tabela 5 Statystyki dot. oświetlenia ulicznego w Ełku w latach 2013-2020 (źródło: Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku).

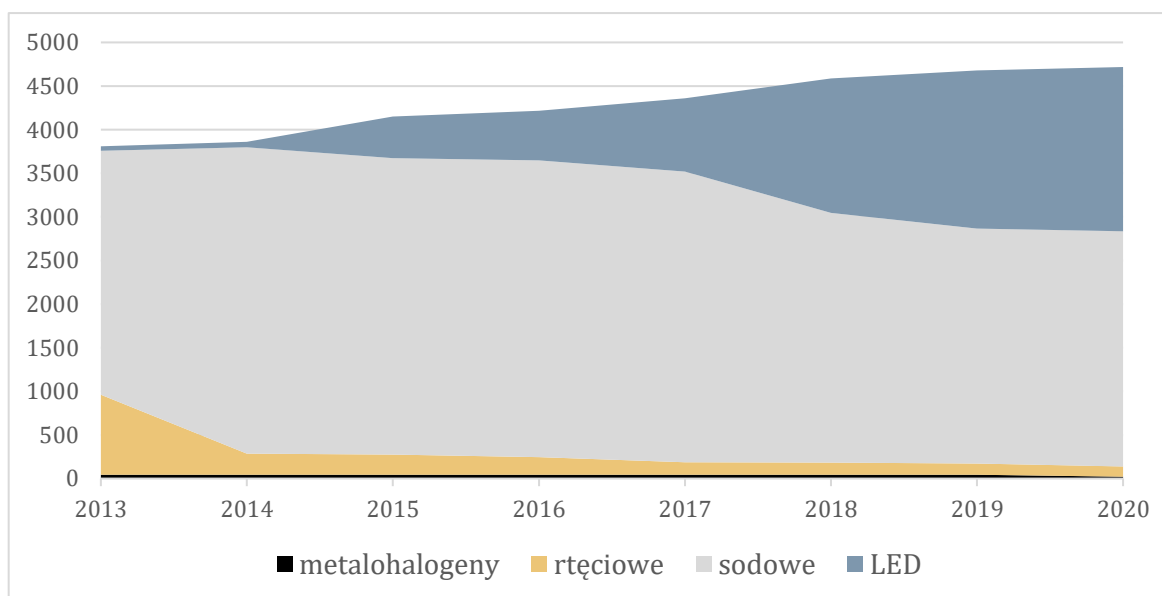

<sup>7</sup> Ul. Piłsudskiego 27

## 3. Sprawozdanie z działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA”

27 maja 2019 r. odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanego budynku Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA”. Odnowiony budynek ECRS znajduje się przy ul. Kościuszki 27 A.

### **Działalność w 2020 r.**

W 2020 r. w ECRS „STAJNIA” funkcjonowały:

- Poradnia Rodzinna,
- Punkt Konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,
- Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Prześstępstwem,
- Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej,
- odbywają się cykliczne spotkania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto pomieszczenia w ECRS „STAJNIA” w 2020 r. były udostępniane podmiotom i organizacjom podejmującym działania na rzecz rodzin ze środowiska lokalnego, przede wszystkim z obszaru rewitalizacji (m.in. Stowarzyszenie „Alternatywa”, Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat, Stowarzyszenie Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku). Z pomieszczeń ECRS „STAJNIA” korzystali również: ŚDS Lawendowy Zakątek, Ełckie Stowarzyszenie Przyjaciół „Amazonki”, Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur”, Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu, Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT, Wojsko Obrony Terytorialnej, 41 Batalion Lekkiej Piechoty, Stowarzyszenie Miłośników Ełku, Ełckie Forum Rewitalizacji w Ełku, Zespół Interdyscyplinarny Miasta Ełk, Klub Seniora „Senior+”.

W 2020 r. w ECRS realizowano takie projekty/kampanie jak:

- Wsparcie Ełckich Rodzin – ZIT - celem projektu jest kompleksowe wsparcie ełckich rodzin oraz rozwój usług społecznych poprzez udział 45 osób - mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez organizację m.in. zajęć z muzykoterapii i dogoterapii dzięki którym poprawia się funkcjonowanie osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej;
- Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia - celem projektu jest zwiększenie aktywności 80 osób w wieku 18-65 lat, zamieszkałych na obszarze rewitalizacji, poprzez aktywizację społeczną i zawodową; realizowane na terenie ECRS „STAJNIA” działania to usługi wspierające animacje lokalne – zajęcia z animatorem, streetworkerem i pracownikiem socjalnym, warsztaty z doradcą zawodowym, warsztaty „zdrowy styl życia” itp.
- Lokalne perspektywy - celem projektu jest rozwój usług społecznych oraz integracja rodzin ze środowiskiem lokalnym poprzez udział 132 osób; uczestnicy projektu mogli

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EŁCKIEGO CENTRUM REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ „STAJNIA”

skorzystać z warsztatów plastycznych, wokalnych, gospodarowania budżetem domowym, treningu psychospołecznego oraz konsultacji indywidualnych;

- Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej - celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 40 osób w wieku 15-40 lat wykluczonych i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta Ełku oraz ich otoczenie (rodzice, rodzeństwo, opiekunowie); zajęcia, które odbywają się w budynku ECRS „STAJNIA”, to m.in. zajęcia sportowe, multimedialne, muzyczne, artystyczno-plastyczne, taneczne oraz wsparcie psychologa/terapeuty;
- Ełk – Bezpieczna Rodzina - projekt dofinansowany był ze środków z ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2020; celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie; w ramach projektu odbywały się zajęcia rozwojowe i wspierające skierowane do rodzin doświadczających przemocy lub zagrożonych przemocą, superwizja oraz szkolenia wyjazdowe dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy, poradnictwo specjalistyczne, indywidualne konsultacje (psychologa, psychologa pracującego z dziećmi, radcy prawnego, traumatologa);
- kampanie społeczne m.in. Kampania Biała Wstążka oraz Pomarańczowa Wstążka.

Ponadto na terenie ECRS „STAJNIA” odbyło się wiele innych zajęć m.in. zajęcia dla seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży. Z powodu dynamicznie zmieniającej się sytuacji związanej z chorobą COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 organizowane działania były dostosowywane do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń. Wiele wydarzeń nie mogło zostać zrealizowanych.

## **Plany na 2021 r.**

Działania ECRS „STAJNIA” będą realizowane we współpracy ze społecznością lokalną (biorąc pod uwagę jej zróżnicowanie) oraz organizacjami i instytucjami na szczeblu lokalnym. Będą podejmowane inicjatywy nastawione na rozwój usług społecznych, animację i wielostronną edukację, działania aktywizujące i integrujące mieszkańców. ECRS „STAJNIA” będzie stale poszukiwać nowych sposobów działania odpowiadając na potrzeby mieszkańców i otoczenia.

Planowane cele działalności ECRS „STAJNIA” na 2021 r.:

- prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii podczas działań realizowanych w ECRS „STAJNIA” oraz przedsięwzięć organizowanych w ramach inicjatyw lokalnych i innych działań;
- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ełku dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EŁCKIEGO CENTRUM REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ „STAJNIA”

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służącej m. in. rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez udostępnianie pomieszczeń podmiotom na działania powiązane z Programem Profilaktyki;
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym;
- reintegracja społeczna i zawodowa osób i rodzin znajdujących się w kryzysie oraz w sytuacji ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym;
- rozwój oferty w kierunku samodzielności i samowystarczalności ECRS "STAJNIA";
- kontynuacja realizacji projektów „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia”, „Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej”, „Lokalne perspektywy” oraz działań Poradni Rodzinnej, Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonych Przemocą, Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;
- kontynuowanie inicjatyw społecznych;
- realizacja projektów „Wsparcie Ełckich Rodzin – MOF” oraz „Wsparcie Ełckich Rodzin- NASZA STAJNIA”;
- realizacja projektu transgranicznego w ramach Programu Współpracy Interreg Litwa – Polska pt. „TRANSGRANICZNA WSPÓLNOTA POROZUMIENIA”.

## Podsumowanie

W 2020 r. kontynuowana była realizacja projektów ujętych w Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023, choć ich zakres bywał ograniczany z powodu zakazów/obostrzeń związanych z wirusem SARS –CoV-2. Biorąc pod uwagę charakterystykę demograficzną Śródmieścia, uwagę zwraca niewielka liczba osób starszych objętych działaniami w ramach rewitalizacyjnych projektów społecznych.

Analiza danych wskazuje, że Śródmieście pozostaje obszarem, w którym mamy do czynienia z kumulacją negatywnych zjawisk społecznych. Pięć lat realizacji programu nie spowodowało znaczącej, pozytywnej zmiany społecznej na tym obszarze. Ubiegłoroczna sytuacja pandemiczna doprowadziła do wzrostu bezrobocia wśród mieszkańców Śródmieścia, co zwiększyło skalę korzystania z pomocy społecznej z powodu ubóstwa. W związku z tym należy zastanowić się nad wprowadzeniem rozwiązań poprawiających efektywność procesu rewitalizacji np. poprzez położenie większego nacisku na aktywizację społeczno-zawodową osób z najsłabszymi szansami na rynku pracy oraz większe wsparcie seniorów.
